



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE GOIÁS

# **PDTI 2016-2018**

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDTI 1º e 2º TRIMESTRE DE 2017**

Goiânia - Julho de 2017

**GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ELABORAÇÃO**

**EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PDTI**

Bruno Henrique de Oliveira Peixoto

Luzia Moreira de Abreu Dourado

**COORDENAÇÃO**

Marcelo Augusto Pedreira Xavier

**GERENTE DE TI**

**APOIO:**

Licardino Siqueira Pires

**CHEFE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Leonardo Ruivo de Mendonça

**CHEFE DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA**

## HISTÓRICO DE VERSÕES

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
11/07/2017	1.0	Elaboração do documento	Luzia M. de A. Dourado
13/07/2017	1.1	Edição e revisão	Marcelo A. P. Xavier

## Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. PLANO DE AÇÕES .....	5
2.1. Plano das Ações / Portal de acompanhamento de projetos .....	5
3. MONITORAMENTO DAS AÇÕES.....	5
3.1. Ações Concluídas (Janeiro a Julho/2017) .....	5
3.2. Ações Em Execução .....	8
3.2.1. Ações em andamento - Em dia – Janeiro a Junho/2017 .....	8
3.2.2. Ações em andamento –atraso na conclusão – Janeiro a Junho/2017 ...	12
4. AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES .....	12
4.1 Acompanhamento das ações.....	12
4.2 Evolução das metas e indicadores.....	13
5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	14
6. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO .....	14
7. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO .....	15

## 1. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás aprovou através da resolução normativa 02/2016 o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o triênio 2016-2018 (PDTI 2016-2018), elaborado em harmonia com o Plano Estratégico Institucional do Tribunal (PEI 2014-2020).

O Plano Diretor de TI (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão por um determinado período. O PDTI permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e plano de ações indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos do Tribunal.

O objetivo do PDTI é apresentar as diretrizes e orientações necessárias para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) em apoio à estratégia institucional do Tribunal. Dessa forma, o PDTI é o principal instrumento que orienta a organização no direcionamento de seus investimentos e aquisições em bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação de forma a maximizar o cumprimento da estratégia.

Este relatório de acompanhamento demonstra os projetos e as iniciativas que foram iniciadas, concluídas e em andamento, seu objetivo é registrar a evolução dos indicadores de monitoramento e dos indicadores de resultado parciais alcançados durante a execução do PDTI durante o primeiro e segundo trimestre de 2017.

## 2. PLANO DE AÇÕES

O plano de ações do PDTI sofreu uma revisão em abril/2017, acrescentando demandas relacionadas aos planos diretores das áreas de negócio do Tribunal. Atualmente, contém um total de 170 ações/projetos.

### 2.1. Plano das Ações / Portal de acompanhamento de projetos

A lista de completa de ações/projetos planejados pode ser visualizada no portal da Gerência de Tecnologia da Informação em <http://gti.tce.go.gov.br/>.

O portal traz também um recurso para acompanhamento de status de cada uma das ações do PDTI, em cumprimento ao artigo Art. 3º da Res. Normativa Nº: 02/2016. As ações de cada projeto são atualizadas diariamente.

Além disso, a exemplo deste relatório, a Gerência de TI publicará relatórios **semestrais** de acompanhamento da execução do PDTI, conforme sistemática definida.

## 3. MONITORAMENTO DAS AÇÕES

### 3.1. Ações Concluídas (Janeiro a Julho/2017)

Neste período foram concluídas 13 ações. Foram listadas as ações concluídas com suas respectivas datas de início e término, bem como o tempo gasto para cada ação. A tabela a seguir identifica estas ações:

ID Nec	Categoria	ID Ação	Descrição da Ação	Iniciado em	Concluído em	Tempo gasto
NC01	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A01.03	Desenvolver sistema de recepção de dados contábeis (TCE-CONTEX)	jan/16	mar/17	15 meses
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	A08.08	Aquisição de Soluções de Segurança da Informação (Firewall / Web Proxy Corporativo)	jan/17	mar/17	2 meses
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A21.02	Autorizar a implantação do novo sistema Artigo 30 (novo)	mar/17	mar/17	1 mes
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A21.03	Realizar a implantação do novo sistema Artigo 30 (novo)	fev/17	mar/17	1 meses
NC39	SERVIÇOS DE TI	A39.01	Realizar aquisição de solução de spam e de solução de Backup de e-mail	nov/16	mar/17	4 meses
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A15.01	Elaborar projeto de implantação do processo eletrônico	jan/17	abr/17	3 meses
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A15.02	Aprovar projeto de implantação do processo eletrônico	fev/17	abr/17	2 meses
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A21.04	Desenvolver módulo de relatório do artigo 30 (novo)	abr/17	abr/17	1 mes
NC22	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A22.02	Desenvolver sistema de monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos	set/16	jun/17	10 meses

<b>NC60</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A60.01</b>	Aprimorar o portal de acesso a informação (SIC)	mar/17	jun/17	4 meses
<b>NC60</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A60.03</b>	Reformular portal da Transparência	mar/17	jun/17	4 meses
<b>NC31</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A31.05</b>	Criar portal da Ouvidoria	mai/17	jun/17	4 meses
<b>NC32</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A32.01</b>	Desenvolver portal de comunicação de irregularidades	mai/17	jun/17	2 meses

### 3.2. Ações Em Execução

As ações em execução foram subdivididas em Ações em dia e Ações com atraso.

#### 3.2.1. Ações em andamento - Em dia – Janeiro a Junho/2017

Até o final do 2º semestre de 2017 haviam 33 ações em andamento, cuja execução está dentro dos prazos previstos no planejamento. Estas ações estão destacadas nas próximas tabelas.

AÇÕES EM ANDAMENTO						
ID Nec	Categoria	ID Ação	Descrição da Ação	Tempo estimado	Iniciado em	Término Previsto
NC17	INFRAESTRUTURA DE TI	A17.03	Realizar aquisição de scanners	4 meses	mai/17	ago/17
NC11	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	A11.02	Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	8 meses	jan/17	ago/17
NC13	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A13.04	Desenvolver projeto de evolução do sistema GPRO	2 meses	mai/17	jun/17
NC14	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	A14.02	Promover o mapeamento de processos de TI baseado no framework COBIT 5	7 meses	jan/18	jul/18
NC14	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	A14.03	Implantar processos de governança mapeados	5 meses	ago/18	dez/18
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A15.03	Desenvolver projeto de implantação do processo eletrônico	20 meses	mai/17	dez/18
NC24	INFRAESTRUTURA DE TI	A24.04	Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE	24 meses	jan/17	dez/18
NC34	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A34.01	Desenvolver sistema GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Módulo de documentos TCE-DOCS)	9 meses	jun/17	fev/18



NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.01	Realizar aquisição de Corel Draw / Photopaint	4 meses	mai/17	ago/17
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.02	Realizar aquisição de Autodesk Autocad	4 meses	mai/17	ago/17
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.03	Realizar aquisição de Adobe PhotoShop	4 meses	mai/17	ago/17
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.04	Realizar aquisição de Adobe Acrobat Pro	4 meses	mai/17	ago/17
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.05	Realizar aquisição de Adobe InDesign	4 meses	mai/17	ago/17
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.06	Realizar atualização do Pacote Microsoft Office	17 meses	ago/17	dez/18
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.09	Realizar investimento em solução de BI	5 meses	mai/17	set/17
NC48	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	A48.01	Realizar diagnóstico de processos de gerenciamento de serviços de TI	7 meses	jan/18	jul/18
NC48	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	A48.02	Mapear e implantar processos	5 meses	ago/18	dez/18
NC56	SERVIÇOS DE TI	A56.15	Evolução GNOI		mai/17	dez/17
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A26.03	Contratar/Desenvolver com equipe interna implementação de painéis de controle e relatórios nos universos de dados disponíveis		jan/18	abr/18
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A31.03	Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle social		ago/18	nov/18
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A31.04	Criar portal do Jurisdicionado		ago/18	nov/18
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A31.07	Desenvolver portal da Diretoria de Planejamento		set/17	dez/17
NC56	SERVIÇOS DE TI	A56.16	Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo		mar/18	jul/18

<b>NC60</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A60.02</b>	Conceber aplicativo móvel para efetivo canal de comunicação com a sociedade, disponibilizando informações transparentes da gestão pública	7 meses	set/17	mar/18
<b>NC36</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A36.01</b>	Auxiliar na gestão novo portal de gestão de pessoas	12 meses	jan/17	dez/17
<b>NC46</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A46.01</b>	Auxiliar na gestão da manutenção no sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP	12 meses	jan/17	dez/17
<b>NC01</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A01.04</b>	Prover solução para de análise de contas	7 meses	set/17	mar/18
<b>NC43</b>	SERVIÇOS DE TI	<b>A43.01</b>	Analisar viabilidade Soluções de armazenamento em nuvem	8 meses	mai/17	dez/17
<b>NC04</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A04.02</b>	Desenvolver sistema de modernização no sistema Plenário Digital (Plenário Virtual)	4 meses	ago/18	nov/18
<b>NC28</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A28.01</b>	Desenvolver projeto de divulgação de ações e atividades de controle externo na internet	4 meses	ago/17	nov/17
<b>NC29</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A29.01</b>	Realizar manutenção dos sistemas existentes para acessibilidade	4 meses	jan/18	mai/18
<b>NC41</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A41.01</b>	Desenvolver portal de divulgação da gestão documental e arquivística	12 meses	jan/18	dez/18
<b>NC51</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A51.01</b>	Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay)	12 meses	jan/18	dez/18

<b>AÇÕES CONTÍNUAS EM ANDAMENTO</b>			
<b>ID</b>	<b>Categoria</b>	<b>ID Ação</b>	<b>Descrição da Ação</b>
<b>Nec</b>			
<b>NC20</b>	PESSOAL DE TI	<b>A20.01</b>	Executar plano de Capacitação dos servidores de TI
<b>NC31</b>	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	<b>A31.02</b>	Desenvolver projeto de melhorias dos serviços do portal institucional
<b>NC56</b>	SERVIÇOS DE TI	<b>A56.01</b>	Garantir continuidade ao negócio através da manutenção e evolução de sistemas diversos
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.01</b>	Executar atividades de desenvolvimento gráfico e tratamentos de fotos para o Jornal Mural ACONTCE
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.02</b>	Efetuar processamento de carga de dados das DUEOF'S, manutenções em dados para consolidar fechamento mensal do Tesouro - sistema GORC
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.03</b>	Realizar atividades de apoio técnico de AUDIOVISUAL em cursos, palestras, Sessões Plenárias e de Câmara, inclusive de transmissão (streaming) e gravação, quando for o caso.
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.04</b>	Garantir continuidade ao negócio através da disponibilização de serviços de suporte técnico ao usuário (CENTRAL DE SERVIÇOS - HELPDESK)
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.05</b>	Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sustentação tecnológica
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.06</b>	Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras
<b>NC57</b>	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	<b>A57.07</b>	Gerenciar outras contratações acessórias

### 3.2.2. Ações em andamento –atraso na conclusão – Janeiro a Junho/2017


Há 02 ações em andamento, cujas execuções estão atrasadas em relação ao cronograma planejado, conforme abaixo:

AÇÕES EM ANDAMENTO						
ID Nec	Categoria	ID Ação	Descrição da Ação	Tempo estimado	Iniciado em	Término Previsto
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A42.12	Realizar aquisição de Software de digitalização de documento com OCR (Kodak Pro)	4 meses	mai/17	ago/17
NC47	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A47.02	Desenvolver sistema para solicitação de diárias	4 meses	mai/17	ago/17

## 4. AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES

### 4.1 Acompanhamento das ações

O resultado consolidado da execução das ações durante o primeiro e segundo trimestre, considerando o total de ações incluídas do PDTI, pode ser visto na figura abaixo:

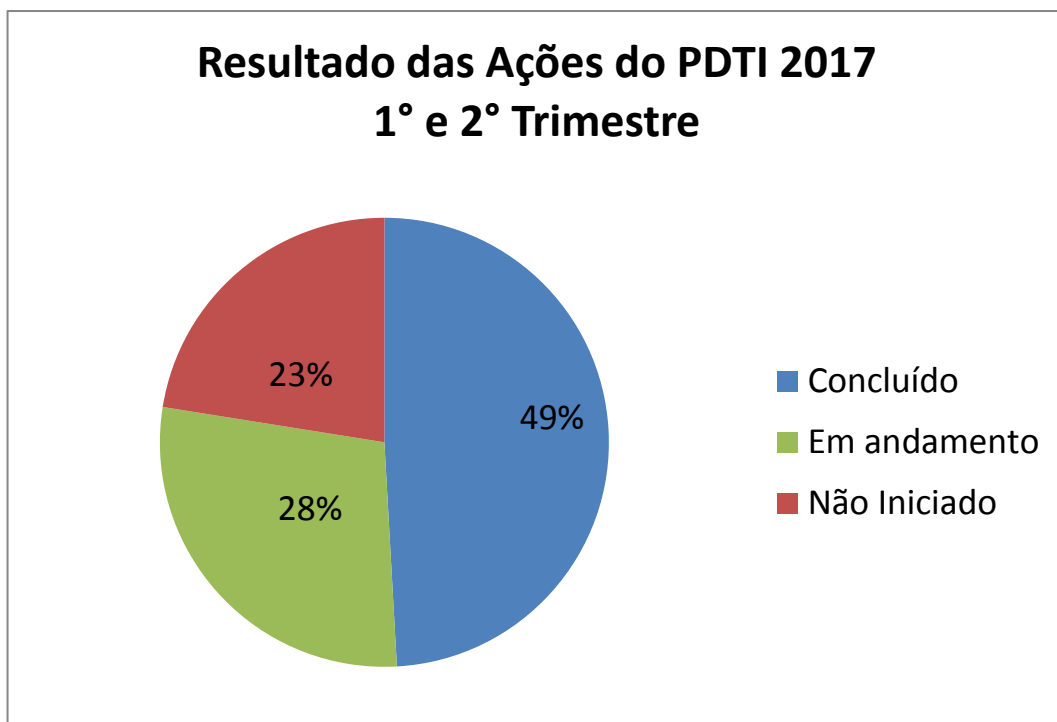

## 4.2 Evolução das metas e indicadores

A tabela a seguir apresenta o alcance das metas definidas no plano de metas do PDTI, bem como o resultado do segundo trimestre de 2017. A maior parte dos indicadores considera apenas a conclusão de todo o conjunto de ações relacionadas a uma mesma necessidade.

O alcance de algumas metas sofreu regresso devido ao acréscimo de novas necessidades e ações. O impacto é destacado em gráfico na planilha de metas, referente ao resultado consolidado do primeiro trimestre, que já incluiu a revisão do PDTI promovida pelo Comitê Estratégico de TI, em abril/2017.

ID Meta	Descrição	Indicador	Meta 2018	2017 - 2º TRIM
M1	Ampliar a oferta de Sistemas de Informação	Percentual de ações executadas de Sistemas de Informação	70%	<b>40%</b>
M2	Aprimorar a Governança e Gestão de TI	Percentual de ações executadas de Governança e Gestão de TI	70%	<b>31%</b>
M3	Aprimorar a Infraestrutura de TI	Percentual de ações executadas de Infraestrutura de TI	90%	<b>79%</b>
M4	Aprimorar aspectos de Pessoal de TI	Percentual de ações executadas de Pessoal de TI	100%	<b>33%</b>
M5	Ampliar a oferta de Serviços de TI	Percentual de ações executadas de Serviços de TI	90%	<b>71%</b>
M6	Cumprir as ações planejadas	Percentual de ações executadas no TOTAL	75%	<b>25%</b>
M7	Qualificar servidores de TI da GER-TI	Executar plano de capacitação dos servidores (NC21)	15	<b>7%</b>
M8	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 2 - Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	75%	<b>21%</b>
M9	Promover a Segurança da Informação	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 3 - Promover a Segurança da Informação	75%	<b>20%</b>
M10	Aprimorar entrega de soluções de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 4 - Aprimorar entrega de soluções de TI	75%	<b>14%</b>
M11	Aprimorar os processos organizacionais de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 5 - Aprimorar os processos organizacionais de TI	75%	<b>33%</b>
M12	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 6 - Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	85%	<b>33%</b>
M13	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 7 - Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	85%	<b>17%</b>

## 5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Foram acompanhados os impactos financeiros envolvidos na execução das ações planejadas no PDTI, já concluídas ou em andamento, mas já com estimativa líquida e certa.

O valor contabilizado para ações executadas no relatório publicado anterior somou a quantia de R\$ 7.427.429,19 (sete milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos). Ao final do segundo trimestre deste ano, a execução deste PDTI já somava a quantia de R\$ 9.308.647,23 (nove milhões e trezentos e oito mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos). Estão registrados os valores que tiveram serviços concluídos e devidamente atestados e aqueles já previstos em contratos em andamento.

Outras contratações estão em andamento, porém tem apenas valores estimados que podem sofrer alteração até a conclusão dos seus respectivos processos licitatórios.

Para as contratações de serviços continuados, o valor descrito abaixo revela o valor executado no período ao qual este relatório se refere.

ID Nec	Categoria	ID Ação	Descrição da Ação	Empenhado/Pago
NC57	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A57.05	Serviços de desenvolvimento de sistemas e sustentação tecnológica	R\$736.797,80
NC57	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A57.06	Serviços de outsourcing de impressoras	R\$69.911,66
NC08	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A08.08	Aquisição de Soluções de Segurança da Informação (Firewall / Web Proxy Corporativo)	R\$ 360.000,00
NC24	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A24.04	Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE (Solução de Backup)	R\$ 298.830,00
NC39	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A39.01	Realizar aquisição de solução de spam de e-mail	R\$ 70.570,00
NC08	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A08.11	Efetivar aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (Adesão ata)	R\$ 202.899,00
NC57	CUSTEIO/ SERVIÇOS	A57.07	Outras contratações acessórias	R\$142.209,58
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 1.881.218,04</b>

## 6. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

Não foram realizadas capacitações no período.


## 7. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

As ações executadas durante este semestre guardam alinhamento com uma parte significativa dos objetivos estratégicos traçados no Plano Diretor de TI 2016-2018.

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	
<b>MISSÃO</b>	Prover serviços de TI alinhados às necessidades do TCE-GO, agregando valor ao cumprimento da missão institucional.
<b>VISÃO</b>	Ser reconhecida como unidade estratégica do TCE-GO pela qualidade, eficiência e relevância dos serviços prestados.
<b>VALORES</b>	Transparência, Efetividade, Colaboração, Celeridade.

PERSPECTIVA	ID	OBJETIVO	% DE NC ATENDIDAS
CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO	1	Aprimorar a Governança de TI	38%
	2	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	21%
	3	Promover a Segurança da Informação	20%
PROCESSOS INTERNOS	4	Aprimorar entrega de soluções de TI	14%
	5	Aprimorar os processos organizacionais de TI	33%
SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	6	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	33%
	7	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	17%
PESSOAS	8	Promover a capacitação dos servidores de TI	0%
	9	Manter adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia	0%
ORÇAMENTO	10	Aprimorar a aplicação de recursos e investimentos em TI	13%

O gráfico a seguir demonstra o alcance atual dos objetivos estratégicos.

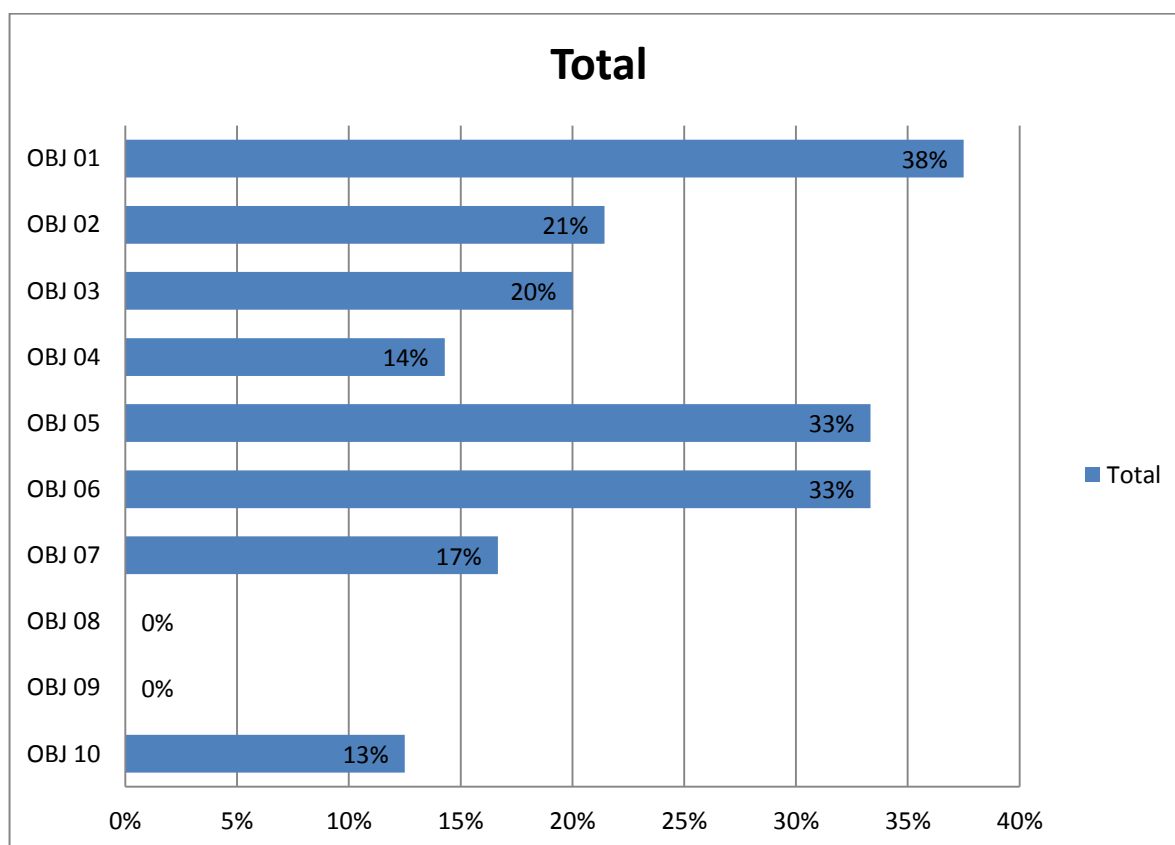

Para conhecer o mapa estratégico completo, acesse a página <http://gti.tce.go.gov.br>, no link PDTI 2016-2018.

## 8. REVISÃO DO PDTI - PRÓXIMAS AÇÕES

Em abril, o Comitê de TI reuniu-se para realizar a primeira revisão do PDTI. A revisão levou em conta a aprovação de novos planos diretores para as unidades do TCE-GO. Durante essa reunião foram priorizadas as ações de curto e médio prazo, considerando ainda, a existência de ações de longo prazo já iniciadas. Desta forma, as ações em já andamento, conforme o item 3.2.1 deste relatório retrata o cenário dos projetos de TI para os próximos meses.

## 9. CONCLUSÃO

Neste primeiro semestre de 2017 chegamos a metade da execução deste PDTI, no que se refere a linha temporal, haja vista que se passou 1 ano e meio, dos 3 anos para qual o plano foi estipulado.

O avanço do resultado atingiu 49%, sendo que outros 28% das ações já estão em andamento, o que torna cada mais real a possibilidade de alcançar as metas previstas.

A presença de uma nova instância de governança, o Comitê Estratégico de TI (CETI), tem contribuído para que as execuções continuem alinhadas às reais necessidades da instituição. A revisão promovida pelo CETI, revelou



pouca necessidade de incluir ou excluir ações existentes, demonstrando que o PDTI já estava bastante alinhado com as proposições que constaram no surgimento de novos planos diretores promovidos pelas unidades nesta nova gestão. A revisão contribuiu ainda, para uma nova priorização das ações.

Desta forma, a Gerência de TI tem cada vez mais se aproximado de alcançar a visão posta neste Plano, de ser reconhecida como uma unidade estratégica, produzindo soluções com cada vez mais qualidade, eficiência e relevância.

É o relatório.

GERÊNCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE  
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, GOIÂNIA - GOIÁS, em 14 de Julho de 2017.
