


Plano de Metas e Indicadores		METAS E INDICADORES					MONITORAMENTO					
ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ID Meta	Descrição	Indicador	Meta	Forma de cálculo	2016 - 1º TRIM	2016 - 2º TRIM	2016 - 3º TRIM	2016 - 4º TRIM	2017 - 1º TRIM	2017 - 2º TRIM
2	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	M01	Ampliar a oferta de Sistemas de Informação	Percentual de ações executadas de Sistemas de Informação	70%	$\frac{\sum (\text{ações de Sistemas de Informação concluídas})}{\sum (\text{total ações de Sistemas de Informação})}$	3%	28%	31%	31%	30%	40%
1	Aprimorar a Governança de TI	M02	Aprimorar a Governança e Gestão de TI	Percentual de ações executadas de Governança e Gestão de TI	70%	$\frac{\sum (\text{ações de Governança e Gestão de TI concluídas})}{\sum (\text{total ações de Governança e Gestão de TI})}$	0%	16%	23%	32%	32%	32%
6	Garantir a atualização e adequação da Infraestrutura, sistemas e serviços de TI	M03	Aprimorar a Infraestrutura de TI	Percentual de ações executadas de Infraestrutura de TI	90%	$\frac{\sum (\text{ações de Infraestrutura de TI concluídas})}{\sum (\text{total ações de Infraestrutura de TI})}$	0%	46%	50%	75%	79%	79%
9	Manter adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia	M04	Aprimorar aspectos de Pessoal de TI	Percentual de ações executadas de Pessoal de TI	100%	$\frac{\sum (\text{ações de Pessoal de TI concluídas})}{\sum (\text{total ações de Pessoal de TI})}$	0%	0%	0%	33%	33%	33%
6	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	M05	Ampliar a oferta de Serviços de TI	Percentual de ações executadas de Serviços de TI	90%	$\frac{\sum (\text{ações de Serviços de TI concluídas})}{\sum (\text{total ações de Serviços de TI})}$	0%	68%	72%	76%	71%	71%
1	Aprimorar a Governança de TI	M06	Cumprir as ações planejadas	Percentual de ações executadas no TOTAL	75%	$\frac{\sum (\text{ações no TOTAL concluídas})}{\sum (\text{total ações no TOTAL})}$	2%	12%	15%	20%	20%	25%
8	Promover a capacitação dos servidores de TI	M07	Qualificar servidores de TI da GER-TI	Executar plano de capacitação dos servidores (NC21)	52%	$\frac{\sum (\text{cursos realizados})}{\sum (\text{cursos planejados})}$	0%	0%	7%	7%	7%	7%
2	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	M08	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 2 - Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	75%	$\frac{\sum (\text{necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico})}{\sum (\text{total de necessidades alinhadas ao objetivo})}$	4%	16%	20%	20%	14%	21%
3	Promover a Segurança da Informação	M09	Promover a Segurança da Informação	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 3 - Promover a Segurança da Informação	75%	$\frac{\sum (\text{necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico})}{\sum (\text{total de necessidades alinhadas ao objetivo})}$	0%	0%	0%	0%	20%	20%
4	Aprimorar entrega de soluções de TI	M10	Aprimorar entrega de soluções de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 4 - Aprimorar entrega de soluções de TI	75%	$\frac{\sum (\text{necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico})}{\sum (\text{total de necessidades alinhadas ao objetivo})}$	0%	0%	7%	7%	7%	14%
5	Aprimorar os processos organizacionais de TI	M11	Aprimorar os processos organizacionais de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 5 - Aprimorar os processos organizacionais de TI	75%	$\frac{\sum (\text{necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico})}{\sum (\text{total de necessidades alinhadas ao objetivo})}$	0%	0%	0%	33%	33%	33%
6	Garantir a atualização e adequação da Infraestrutura, sistemas e serviços de TI	M12	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 6 - Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	85%	$\frac{\sum (\text{necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico})}{\sum (\text{total de necessidades alinhadas ao objetivo})}$	0%	29%	29%	29%	25%	33%
7	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	M13	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 7 - Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	85%	$\frac{\sum (\text{necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico})}{\sum (\text{total de necessidades alinhadas ao objetivo})}$	0%	0%	17%	17%	17%	17%

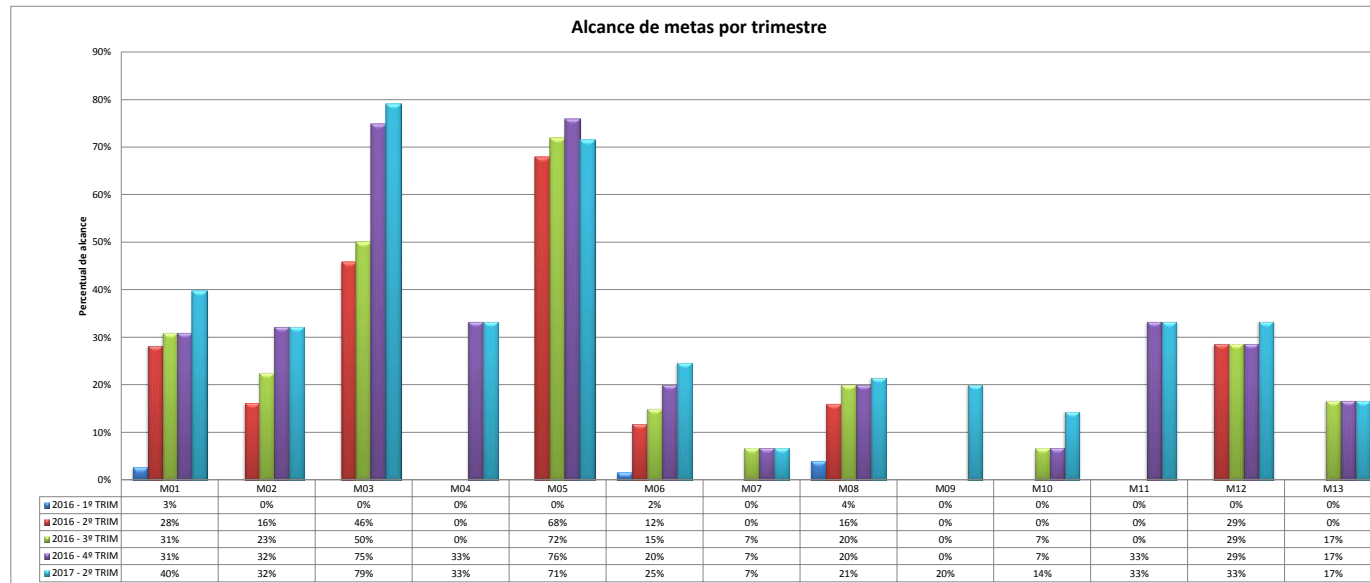

PDTI - Inventário de Necessidades											
ID	Categoria	Necessidade de TI	Descrição da Necessidade	Qtd de Área(s) Demandante(s)	Alinhamento Estratégia	Alinhamento TI	Prioridade	Conclusão	TOTAL DE AÇÕES PLANEJADAS	TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS	
NC01	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	Solução para permitir a transmissão de informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira e Plano de Contas Aplicado ao Serviço Público (PCASP) de acordo com a Nova Contabilidade e a centralização e consolidação de todas as movimentações financeiras dos jurisdicionados, e implementação de procedimentos padronizados para auditar a	2	3	1	675	75%	4	3	
NC02	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	Solução para relacionar e requisitar dos jurisdicionados os procedimentos de licitação e contratos para o exercício das atividades inerentes a sua área de atuação, mediante critérios previamente estabelecidos.	1	6	1	675	100%	3	3	
NC03	SERVIÇOS DE TI	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados	Contratação de empresas prestadoras de serviços técnicos especializadas em desenvolvimento e manutenção de software e infraestrutura de TI.	1	2	1	650	100%	3	3	
NC04	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário	Solução para realização de sorteio eletrônico de relatorias (cliente).	3	2	2	650	50%	2	1	
NC05	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares	Solução para manter base de dados dos responsáveis julgados irregulares, a fim de detectar reincidências e aplicar sanções mais efetivas.	1	2	1	650	0%	1	0	
NC06	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões	Solução para monitorar a efetividade do cumprimento de decisões.	2	2	1	625	50%	2	1	
NC07	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	Solução para cadastramento, classificação, indexação, buscas dinâmicas de atos normativos e jurisprudência, com vários níveis de refinamento e a emissão de relatórios gerenciais, afim de auxiliar na elaboração de pareceres.	6	4	1	625	50%	2	1	
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	Aquisição e implantação de softwares, equipamentos de infraestrutura de TI.	10	2	4	600	86%	14	12	
NC09	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris	Necessidade de correções de inconformidades no atual sistema e evolução das funcionalidades para atender mudanças de requisitos.	11	3	3	600	100%	2	2	
NC10	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação de Comitê Estratégico de TI	Conscientização da alta administração e das unidades do TCE-GO da importância de um Comitê de TI composto por diversas áreas da instituição para tomada de decisões estratégicas sobre TI.	2	6	2	575	100%	3	3	
NC11	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	Desenvolvimento e implementação de metodologia de inclusão e acompanhamento de projetos do portfólio de projetos de TI	1	3	2	575	67%	3	2	
NC12	PESSOAL DE TI	Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI.	Fomentar a realização de concursos públicos e o estabelecimento de mecanismos de reconhecimento dos servidores tais como a meritocracia e gratificações por desempenho.	1	1	1	575	50%	2	1	
NC13	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema GPRO	Necessidade de correções de inconformidades no atual sistema e também, evolução das funcionalidades para atender mudanças de requisitos.	11	1	2	575	75%	4	3	
NC14	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da governança de TI	Desenvolvimento da maturidade dos processos de trabalho da área de TI do TCE-GO afim de que possa avaliar, dirigir e monitorar as ações de TI do Tribunal.	1	8	2	550	0%	3	0	
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão da implantação de processo eletrônico	Efetivação do processo eletrônico com a completa eliminação de papel em trâmites de documentos.	3	3	1	550	67%	3	2	
NC16	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	Monitoramento contínuo do PDTI 2016-2018 afim de garantir sua execução, além de promover transparência das ações de TI para o Tribunal	2	4	1	550	100%	2	2	
NC17	INFRAESTRUTURA DE TI	Modernização do parque tecnológico	Aquisição de equipamentos de TI voltados para os usuários.	7	5	3	550	50%	4	2	
NC18	SERVIÇOS DE TI	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral	Capacitação para os usuários das demais unidades no TCE nos sistemas desenvolvidos internamente.	12	1	2	550	0%	1	0	
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	Realização de ações que visam proteger a confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações do TCE	2	6	2	525	29%	7	2	
NC20	PESSOAL DE TI	Capacitação dos servidores de TI	Capacitação de servidores da TI do TCE-GO para que possam sustentar as atividades da GER-TI.	1	1	1	525	0%	1	0	
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.	Solução para controlar as prestações de contas fora do prazo e as reincidências dos que perderam os prazos ou não prestaram as contas, bem como a possibilidade de verificar se o jurisdicionado está regular e com a declaração completa, atendendo as regras de declaração fora do prazo conforme artigo 288 do Regimento Interno do TCE-GO.	1	2	2	525	100%	4	4	
NC22	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos	Solução de monitoramento da tramitação dos processos (Follow-Up), em que seja possível listar os processos que excederam os prazos de permanência em um determinado setor.	3	4	1	525	100%	2	2	
NC23	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos	Necessidade futura de alterações no GPRO com relação a auditores poderem relatar processos,	1	1	1	525	0%	1	0	
NC24	INFRAESTRUTURA DE TI	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede	Avaliação de recursos de detecção de incêndios, refrigeração, redundância elétrica, controles de acesso físico e lógicos e realizar as devidas adequações.	1	2	1	500	75%	4	3	
NC25	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa	Solução de gestão educacional para gerenciar matrículas, cursos, turmas, certificados, ementas, professores, materiais, alunos e frequência, emissão de, avaliação de reação/satisfação online.	1	1	1	500	0%	1	0	
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	Software de BI para gerenciamento de informações, consultas, relatórios dinâmicos, ferramentas de análises e de visualização, tabelas dinâmicas, cockpits, dashboards e performance de gestão, afim de possibilitar a tomada de decisões de forma segura.	2	7	2	500	17%	6	1	
NC27	SERVIÇOS DE TI	Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais	Implantação de rede social no TCE	1	2	2	500	100%	1	1	
NC28	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo	Espaço para divulgação dos trabalhos realizados (auditorias, monitoramentos), como forma de mostrar à sociedade o desempenho do Tribunal	1	1	1	475	0%	1	0	
NC29	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade	Melhoria da acessibilidade nos sistemas internos para deficientes visuais.	2	1	1	475	0%	1	0	

NC30	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAPP	Implantação do sistema GAPP (Auditoria de Folha de Pagamento).	2	3	1	475	0%	1	0
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	Necessidade de permitir que pessoas jurídicas também emitam certidões, e ambas pessoas físicas e jurídicas possam ser validadas por sistema integrado com a Receita Federal.	2	3	1	475	29%	7	2
NC32	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades	Portal de informações de ações do governo (com o nome Você é o fiscal do TCE), para mostrar ao cidadão essas ações que este possa fiscalizar e, se não forem executadas, o cidadão possa denunciar por este portal.	1	2	1	475	100%	1	1
NC33	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	Solução para coleta de dados sobre todas as contratações de pessoal realizadas pelos jurisdicionados, com caráter temporário.	1	5	1	475	0%	1	0
NC34	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística	Solução para gestão eletrônica de documentos arquivísticos em conformidade com os critérios do Conselho Nacional de Arquivologia - CONARQ	8	1	1	450	0%	1	0
NC35	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019	Elaboração do plano diretor de TI para o biênio 2018-2019.	1	3	1	450	0%	2	0
NC36	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Modernização do Portal de Gestão de Pessoas	Reformulação do portal de Gestão de Pessoas a fim de se ter maior integração com o sistema de RH.	1	2	1	450	0%	1	0
NC37	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado	Sistema com histórico dos jurisdicionados que seja traçado a partir de informações da execução orçamentária para identificar a estrutura administrativa desde 2003, e permitir uma integração da consolidação das informações financeiras do art. 30 com as atividades da execução orçamentária.	1	2	1	450	0%	2	0
NC38	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI	Promoção da revisão das atribuições da Gerência de TI e seus serviços subordinados e a formalização através de normativo específico	1	1	1	450	100%	1	1
NC39	SERVIÇOS DE TI	Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo	Adquirir solução de spam e Backup para o serviço de email corporativo.	1	2	1	425	100%	1	1
NC40	SERVIÇOS DE TI	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração Pública	Obtenção de informações para localizar pessoas que devem citadas/intimadas, foi sugerido que se firme parcerias com órgãos como Polícia, CELG, Detran, para possibilitar o acesso a este tipo de dado.	5	4	1	425	100%	1	1
NC41	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental	Portal da área de Gestão de Documental, para divulgação dos andamento e dos resultados do projeto em andamento no Tribunal.	3	1	1	425	0%	1	0
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	Aquisição de softwares utilizados para o tratamento de imagens, desenhos de engenharia, edição de texto, etc.	8	1	3	400	0%	11	0
NC43	SERVIÇOS DE TI	Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem	Estudo para implantação, aquisição ou liberação de acesso aos serviços de armazenamento de dados em nuvem.	1	1	2	375	0%	2	0
NC44	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas	Cumprimento do art. 287, da Lei 8730/93 e a Resolução 134/94 TCE-GO, gerenciar informações e permitir o descarte dos papéis decorrido o prazo de armazenamento	1	4	2	375	0%	1	0
NC45	SERVIÇOS DE TI	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias)	Definição de padrões para aumentar a eficiência e a continuidade do negócio na TI.	2	2	1	350	67%	3	2
NC46	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP	Solução de unificação de dados da gerência administrativa e financeira com a adequação dos requisitos da nova contabilidade, além de outros aprimoramentos	1	1	1	350	0%	1	0
NC47	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver solução para solicitação de diárias	Criação de um sistema para solicitação de diárias on-line	1	1	1	350	50%	2	1
NC48	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI	Aplicação das melhores práticas de gerenciamento de TI no TCE-GO.	1	2	3	325	0%	3	0
NC49	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais	Permitir a gestão de processos de negócio modelados, com ferramentas de diagramação de processos em BPMN integradas ao modelador e que implemente a automação e monitoramento das atividades.	2	1	1	325	0%	1	0
NC50	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para gestão do conhecimento	Sistema colaborativo para gestão do conhecimento desenvolvido no TCE-GO.	1	1	1	325	100%	1	1
NC51	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização	Desenvolvimento de portal corporativo nos moldes de uma intranet.	2	3	1	300	0%	1	0
NC52	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial	Desenvolvimento de solução de ordens de serviço para gestão da manutenção predial	1	1	1	300	100%	3	3
NC53	INFRAESTRUTURA DE TI	Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias	Equipamentos para dar suporte à transmissão da sessão plenária na nova sede	1	2	1	275	100%	2	2
NC54	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	Conclusão do sistema de Registro de atos de concessão.	1	4	1	700	0%	1	0
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	Realizar a manutenção corretiva e evolutiva nos sistemas em produção conforme demandas pontuais dos usuários	17	2	1	700	75%	16	12
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	Promover a continuidade dos serviços de TI em níveis acordados, apropriados ao negócio, através da gestão de contratações, soluções e ativos diversos. Prover suporte técnico adequado através da central de serviços (HELPDESK).	16	2	4	700	0%	7	0
NC58	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD)	Necessidade de solução de gestão corporativa de riscos (MMD)	1	1	1	700	0%	1	0
NC59	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover solução para gestão de convênios (MMD)	Necessidade de solução para gestão de convênios (MMD)	1	1	1	700	0%	1	0
NC60	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal	Atendimento de quesitos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Cumprimento das determinações da LAI (Lei nº 12.527/2011), e no âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013 ofertando à sociedade informações e dados sobre a gestão do Tribunal em busca da efetivação da transparência e do direito de acesso à informação.	1	1	2	700	67%	3	2

NC61	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos	Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos	1	1	1	700	0%	1	0
NC62	SERVIÇOS DE TI	Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO	Implantar novos canais, preferencialmente eletrônicos, de comunicação com o público interno.	1	1	1	700	0%	1	0

CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DE NECESSIDADES	META - %	META - QTDE	%	CONCLUÍDO
Sistemas de Informação	37	70%	26	19%	7
Governança e Gestão de TI	9	70%	6	33%	3
Infraestrutura de TI	4	90%	4	25%	1
Pessoal de TI	2	100%	2	0%	0
Serviços de TI	9	90%	8	44%	4
TOTAL	61	75%	46	25%	15

o de Ações																						
ID Nec	Categoria	Necessidade de TI	ID Ação	Descrição da Ação	Responsável	Trim.	Tempo estimado	Início Previsto	Término Previsto	Iniciado em	Concluído em	Tempo gasto	INVESTIMENTO / CUSTEIO	VALOR ESTIMADO	EMPENHADO/GASTO	Status	Conclusão	Situação	Rem	PRIORIDADE - PLANO DIRETOR		
NC01	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	A01.01	Definir sistemática de recepção de dados contábeis	SERV-SISTEMAS	3	3 meses	set/15	abr/16	set/15	jan/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	001		
NC01	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	A01.02	Definir layouts de recepção de dados contábeis	SERV-SISTEMAS	3	3 meses	set/15	abr/16	jan/16	mar/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	002		
NC01	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	A01.03	Desenvolver sistema de recepção de dados contábeis (TCE-CONTEX)	SERV-SISTEMAS	3	10 meses	set/15	fev/17	jan/16	mar/17	10 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2017-1	003		
NC01	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	A01.04	Prover solução para de análise de contas	SERV-SISTEMAS	4	7 meses	set/17	mar/18	jun/17			2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação reavaliada	004	2-Médio prazo
NC02	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	A02.01	Desenvolver sistema para recepção de dados através de formulários dinâmicos (TCE-INFORMA)	SERV-SISTEMAS	3	3 meses	nov/15	jan/16	dez/15	fev/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	005		
NC02	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	A02.02	Definir formulários no sistema para fiscalização de licitações e contratos	SERV-SISTEMAS	3	3 meses	nov/15	jan/16	fev/16	abr/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	006		
NC02	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	A02.03	Implantação do sistema para fiscalização de licitações e contratos (TCE-INFORMA)	SERV-SISTEMAS	3	3 meses	nov/15	jan/16	abr/16	jun/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-2	007		
NC03	SERVIÇOS DE TI	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados	A03.01	Definir modelos de mensuração e de acordos de nível de serviço e metologia (MGDA-TCE) para desenvolvimento de sistemas	SERV-SISTEMAS	2	4 meses	set/15	abr/16	set/15	dez/15	3 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	008		
NC03	SERVIÇOS DE TI	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados	A03.02	Elaborar PROJETO BÁSICO (TERMO DE FERÊNCIA) contendo especificação para contratação de serviço terceirizados.	GER-TI	2	3 meses	set/15	abr/16	dez/15	mar/16	4 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	009		
NC03	SERVIÇOS DE TI	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados	A03.03	LICITAÇÃO para contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados	PRESIDENCIA	2	3 meses	abr/16	jun/16	mar/16	set/16	7 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-3	010		
NC04	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário	A04.01	Efetuar manutenções no sistema para atendimento das Seções Plenárias, inserir cambios e numerações nos acordos e resoluções gerados pelo sistema PLENÁRIO DIGITAL	SERV-SISTEMAS	4	10 meses	dez/15	dez/16	jan/16	mar/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	011		
NC04	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário	A04.02	Desenvolver sistema de modernização no sistema Plenário Digital (Plenário Virtual)	SERV-SISTEMAS	4	4 meses	ago/18	nov/18	ma/17			3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Em andamento	0		012	
NC05	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares	A05.01	Desenvolver sistema para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares	SERV-SISTEMAS	2	4 meses	ago/18	nov/18				-	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Não Iniciado	0	Prioridade Revista	013	
NC06	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões	A06.01	Avaliar sistemática de acompanhamento de decisões	GER-TI	1	3 meses	nov/15	dez/15	jan/16	ma/16	5 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-2	014		
NC06	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões	A06.02	Desenvolver sistema para monitoramento de decisões	SERV-SISTEMAS	1	5 meses	mar/18	jul/18				-	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação reavaliada	015	3-Longo prazo
NC07	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	A07.01	Desenvolver projeto de sistema para consolidação de normas e jurisprudência	SERV-SISTEMAS	2	3 meses	jun/15	nov/15	ago/15	dez/15	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	016		
NC07	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	A07.02	Desenvolver sistema para consolidação de normas e jurisprudência	SERV-SISTEMAS	2	6 meses	abr/18	set/18				-	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$	-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação reavaliada	017	3-Longo prazo
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.01	Estabelecer Central de Monitoramento de Ativos (Implantação do Zabbix)	SERV-SISTEMAS	3	3 meses	ago/15	abr/16	out/15	mar/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	018		
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.02	Realizar aquisição de ferramenta de acesso remoto estável	SERV-SISTEMAS	1	5 meses	ago/18	dez/18				-	INVESTIMENTO	R\$	25.000,00	R\$	-	Não Iniciado	0		019
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.03	Elaborar especificação para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores	SERV-SISTEMAS	1	2 a 3 meses			jan/16	fev/16	2 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	020		
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.04	Elaborar pesquisa orçamentária para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores	GER-TI	1	2 a 3 meses			fev/16	mar/16	2 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	021		
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.05	LICITAÇÃO para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores	PRESIDENCIA	1	2 a 3 meses			mar/16	jun/16	3 meses	INVESTIMENTO	R\$	144.000,00	R\$	-	Concluído	1	2016-2	022	
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.06	Aprimoramento de recursos do Banco de Dados (Oracle Enterprise)	GER-TI	1	2 a 3 meses			out/16	dez/16	3 meses	INVESTIMENTO	R\$	200.000,00	R\$	1.108.052,00	Concluído	1	2016-4	023	
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.07	Realizar aquisição de equipamentos servidores	GER-TI	1	2 a 3 meses			out/16	dez/16	3 meses	INVESTIMENTO	R\$	3.00.000,00	R\$	253.209,21	Concluído	1	2016-4	024	
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.08	Aquisição de Soluções de Segurança da Informação (Firewall / Web Proxy Corporativo)	GER-TI	1	2 a 3 meses			jan/17	mar/17	3 meses	INVESTIMENTO	R\$	1.000.000,00	R\$	360.000,00	Concluído	1	2017-1	025	
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.09	Elaborar especificação para aquisição de licenças de sistema de virtualização (VM-WARE)	SERV-SISTEMAS	1	2 a 3 meses			jan/16	fev/16	2 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	026		
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.10	Elaborar pesquisa orçamentária para aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (SISTEMA)	GER-TI	1	2 a 3 meses			fev/16	mar/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Concluído	1	2016-1	027		
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.11	Efetivar aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (Adesão ano)	PRESIDENCIA	1	2 a 3 meses			mar/16	jun/16	3 meses	INVESTIMENTO	R\$	225.000,00	R\$	427.849,00	Concluído	1	2016-2	028	
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.12	Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento)	GER-TI	1	7 meses	jan/18	jul/18				-	CUSTEIO	R\$	45.000,00	R\$	-	Não Iniciado	0		029
NC08	INFRAESTRUTURA DE TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	A08.13	Contratação de Serviços de Manutenção de BANCO DE DADOS-ORACLE	GER-TI	1	2 a 3 meses			ma/16	jun/16	2 meses	CUSTEIO	R\$	80.000,00	R\$	8.500,44	Concluído	1	2016-2	030	

NC08	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Manutenção, atualização e melhoria do armazenamento de TI do TCE-RS (Cloud Storage)	A08.14	Realização de Equipamentos de armazenamento (Discos Storage)	GER-TI	1	2 a 3 meses			out/16	dez/16	3 meses	INVESTIMENTO	RS	50.000,00	RS	147.000,00	Concluído	1	2016-4	031			
NC09	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris	A09.01	Desenvolver projeto (fase de planejamento) de evolução do sistema TCE-Juris	SERV-SISTEMAS	1	2 a 3 meses			abr/16	mai/16	1 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		RS	-	Concluído	1	2016-2	032			
NC09	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris	A09.02	Executar projeto de evolução do sistema TCE-Juris (Consulta de Decisões do TCE)	SERV-SISTEMAS	1	6 meses			abr/16	jul/16	abr/16	ago/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		-	Concluído	1	2016-3	033		
NC10	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Constituição de Comitê Estratégico de TI	A10.01	Propor a implantação de comitê de TI	GER-TI	2	1 meses			jun/16	jul/16	jun/16	ago/16	1 meses	PROCESSO INTERNO	RS		-	Concluído	1	2016-3	034		
NC10	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Constituição de Comitê Estratégico de TI	A10.02	Aprovar a implantação de Comitê de TI	PRESIDENCIA	2	2 meses			jul/16	ago/16	ago/16	nov/16	4 meses	PROCESSO INTERNO	RS		-	Concluído	1	2016-4	035		
NC10	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Constituição de Comitê Estratégico de TI	A10.03	Implantar Comitê de TI	PRESIDENCIA	2	4 meses			ago/16	nov/16	nov/16	dez/16	1 meses	PROCESSO INTERNO	RS		-	Concluído	1	2016-4	036		
NC11	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	A11.01	Elaborar metodologia de gestão de demandas e projetos	SERV-SISTEMAS	1	6 meses			abr/16	jul/16	mar/16	ago/16	1 meses	PROCESSO INTERNO	RS		-	Concluído	1	2016-3	037		
NC11	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	A11.02	Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	GER-TI	1	8 meses			jan/17	ago/17	ago/16		12 meses	PROCESSO INTERNO	RS		-	Em andamento	0	Em dia	038		
NC11	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	A11.03	Desenvolver Portal de Acompanhamento de Projetos de TI, com demonstração do status dos projetos	SERV-SISTEMAS	1	2 a 3 meses				mar/16	jun/16	4 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2016-2	039		
NC12	PESSOAL DE TI	Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI.	A12.01	Promover estudo sobre a necessidade de contratação de pessoal efetivo para a área de TI	GER-TI	2	24 meses			jan/17	dez/18			-	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Não Iniciado	0		040	
NC12	PESSOAL DE TI	Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI.	A12.02	Promover ações de avaliação de desempenho e de reconhecimento (meritocracia) e valorização dos servidores de TI.	GER-TI	2	1 a 6 meses				jun/16	dez/16	7 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2016-4	041		
NC13	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema GPRO	A13.01	Implementar recursos de pesquisa avançada no sistema GPRO	SERV-SISTEMAS	2	5 a 6 meses				jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		RS	-	Concluído	1	2016-1	042		
NC13	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema GPRO	A13.02	Corrigir erros na tela de criação de Outros tipos de documentos no GPRO	SERV-SISTEMAS	2	5 a 6 meses				jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		RS	-	Concluído	1	2016-1	043		
NC13	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema GPRO	A13.03	Permitir gerar Ofícios sem vínculo de processos no GPRO	SERV-SISTEMAS	2	5 a 6 meses				jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		RS	-	Concluído	1	2016-1	044		
NC13	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema GPRO	A13.04	Desenvolver projeto de evolução do sistema GPRO	SERV-SISTEMAS	2	2 meses			mai/17	jun/17	jan/17		7 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		RS	-	Em andamento	0	Em dia	045	
NC14	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da governança de TI	A14.01	Avaliar a governança de TI do TCE	GER-TI	4	12 meses			jan/18	dez/18			-	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Não Iniciado	0		046	
NC14	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da governança de TI	A14.02	Promover o mapeamento de processos de TI baseado no framework COBIT 5	GER-TI	4	7 meses			jan/18	jul/18	dez/16		8 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Em andamento	0	Em dia	047	
NC14	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da governança de TI	A14.03	Implantar processos de governança mapeados	GER-TI	4	5 meses			ago/18	dez/18	dez/16		8 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Em andamento	0	Em dia	048	
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão de implantação do processo eletrônico	A15.01	Elaborar projeto de implantação do processo eletrônico	GER-TI	3	4 meses			jan/17	mai/17	jan/17	abr/17	1 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2017-2	049	
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão de implantação do processo eletrônico	A15.02	Aprovar projeto de implantação do processo eletrônico	PRESIDENCIA	3	2 meses			mai/17	jun/17	fev/17	abr/17	2 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2017-3	050	
NC15	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão da implantação de processo eletrônico	A15.03	Desenvolver projeto de implantação do processo eletrônico	SERV-SISTEMAS	3	20 meses			mai/17	dez/18	jan/17		7 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS		RS	-	Em andamento	0	Em dia	051	3-Longo prazo
NC16	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	A16.01	Desenvolver sistemática de acompanhamento das ações do PDTI	GER-TI	1	1 meses			out/15	jan/16	abr/16	abr/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2016-1	052	
NC16	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	A16.02	Desenvolver Portal de Acompanhamento de Execução do PDTI	GER-TI	1	2 a 3 meses				abr/16	jun/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2016-2	053		
NC17	INFRAESTRUTURA DE TI	Modernização do parque tecnológico	A17.01	Realizar aquisição de computadores	SERV-SUPOORTE	1	2 a 3 meses				jun/16	dez/16	7 meses	INVESTIMENTO	RS	800.000,00	RS	1.922.000,00	Concluído	1	2016-4	054		
NC17	INFRAESTRUTURA DE TI	Modernização do parque tecnológico	A17.02	Realizar aquisição de monitores	SERV-SUPOORTE	1	2 a 3 meses				out/16	dez/16	3 meses	INVESTIMENTO	RS	100.000,00	RS	124.200,00	Concluído	1	2016-4	055		
NC17	INFRAESTRUTURA DE TI	Modernização do parque tecnológico	A17.03	Realizar aquisição de scanners	SERV-SUPOORTE	1	4 meses			mai/17	ago/17	dez/16		8 meses	INVESTIMENTO	RS	250.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	056	
NC17	INFRAESTRUTURA DE TI	Modernização do parque tecnológico	A17.04	Realizar aquisição de Dispositivos Móveis (Notebooks/Tablets/Smartphones)	SERV-SUPOORTE	1	12 meses			jan/18	dez/18			-	INVESTIMENTO	RS	320.000,00	RS	-	Não Iniciado	0		057	
NC18	SERVIÇOS DE TI	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral	A18.01	Promover capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral	SERV-SUPOORTE	6	17 meses			ago/17	dez/18	jan/16		10 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Em andamento	0	Ação Continuada	058	
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.01	Avaliar a segurança da informação do TCE	GER-TI	6	5 meses			ago/17	dez/17			-	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Não Iniciado	0		059	
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.02	Revisar e implantar a Política Corporativa de Segurança da Informação	GER-TI	6	5 meses			ago/17	dez/17			-	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Não Iniciado	0		060	
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.03	Constituir grupo de trabalho de Segurança da Informação	GER-TI	3	5 meses			ago/17	dez/17			-	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Não Iniciado	0		061	
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.04	Elaborar e implantar normas complementares à Política de Segurança da Informação, no tocante a: classificação e tratamento da informação, monitoramento e controle de acesso	GER-TI	3	5 meses			ago/17	dez/17			-	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Não Iniciado	0		062	

NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.05	Automatizar processos de gestão usuários considerando delegamentos no sistemas da Gestão de Pessoas.	GER-TI	1	2 a 3 meses		mar/16	abr/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	063				
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.06	Revisar procedimentos de gestão usuários e níveis de acesso aos sistemas do TCE	GER-TI	1	2 a 3 meses		mar/16	jun/16	4 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-2	064				
NC19	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	A19.07	Realizar ações de conscientização (workshops) sobre Segurança da Informação no TCE-GO.	GER-TI	8	18 meses		ago/17	ago/18		-	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Não Iniciado	0	Prioridade Revista	065			
NC20	PESSOAL DE TI	Capacitação dos servidores de TI	A20.01	Executar plano de Capacitação dos servidores de TI	GER-TI	8	19 meses		jun/17	dez/18	jan/16		19 meses	INVESTIMENTO	RS	R\$ 277,11	RS	-	Em andamento	0	Ação Continuada	066	
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.	A21.01	Conclusão do desenvolvimento do sistema Artigo 30 (novo)	SERV-SISTEMAS	1	3 meses		jan/16	mar/16	fev/16	mar/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	067		
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.	A21.02	Autorizar a implantação do novo sistema Artigo 30 (novo)	PRESIDENCIA	1	3 meses		jan/16	mar/16	mar/17	mar/17	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2017-1	068		
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.	A21.03	Realizar a implantação do novo sistema Artigo 30 (novo)	SERV-SISTEMAS	1	3 meses		jan/16	mar/16	fev/17	mar/17	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2017-1	069		
NC21	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver módulo de relatório do artigo-30 (novo)	A21.04	Desenvolver módulo de relatório do artigo-30 (novo)	SERV-SISTEMAS	1	2 meses		mai/17	jun/17	abr/17	abr/17	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2017-4	070		
NC22	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar avaliação de monitoramento de tramitação de atos processuais produção de documentos	A22.01	Levantamento de necessidades para o monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos	SERV-SISTEMAS	2	1 a 3 meses			mai/16	set/16	12 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-3	071			
NC22	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar avaliação de monitoramento de tramitação de atos processuais produção de documentos	A22.02	Desenvolver sistema de monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos	SERV-SISTEMAS	2	5 meses		mai/17	set/17	set/16	jun/17	10 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2017-5	072	2-Médio prazo	
NC23	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos	A23.01	Desenvolver a adequação necessária nos sistemas para que conselheiros substitutos relatem processos	SERV-SISTEMAS	2	4 meses		ago/18	nov/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0		073		
NC24	INFRAESTRUTURA DE TI	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede	A24.01	Acompanhar a instalação dos ativos de TI da NOVA SEDE (SWITCHES, WIRELESS, CFTV, CONTROLES DE ACESSO)	SERV-SUORTE	1	2 a 3 meses			fev/16	jun/16	5 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-2	074			
NC24	INFRAESTRUTURA DE TI	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede	A24.02	Acompanhar a mudança do Datacenter (Moving) - NOVA SEDE	GER-TI	1	3 meses		mai/16	jul/16	mai/16	ago/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-3	075		
NC24	INFRAESTRUTURA DE TI	Aprimoramento da infraestrutura do datacenter da nova sede	A24.03	Apimoramento da infraestrutura do datacenter da nova sede	GER-TI	2	6 meses		jul/16	dez/16	ago/16	dez/16	5 meses	INVESTIMENTO	RS	R\$ 1.000.000,00	RS	R\$ 1.301.350,00	Concluído	1	2016-4	076	
NC24	INFRAESTRUTURA DE TI	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede	A24.04	Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE	GER-TI	4	24 meses		jan/17	dez/18	dez/16		8 meses	INVESTIMENTO	RS	RS	R\$ 298.830,00	Em andamento	0	Em dia	077		
NC25	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa	A25.01	Desenvolver sistema de gestão educacional corporativa	SERV-SISTEMAS	1	12 meses		jan/18	dez/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0		078		
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	A26.01	Desenvolver solução de cruzamento de informações (Viabilizar implantação do PENTAHQ)	SERV-SISTEMAS	2	5 a 6 meses			fev/16	mai/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-2	079			
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	A26.02	Prover suporte para análise de dados de obras públicas (extraído do GEOBRAS)	SERV-SISTEMAS				out/17	out/17			-	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	080	1-Curto prazo	
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	A26.03	Contratar/Desenvolver com equipe interna implementação de painéis de controle e relatórios nos universos de dados disponíveis	SERV-SISTEMAS				jan/18	abr/18	abr/17		4 meses	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	081		
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	A26.04	Prover suporte para Análise de dados no Sistema INFORMA e construção de tribas de auditoria úteis para a fiscalização tempestiva e concomitante dos processos licitatórios do Estado de Goiás	SERV-SISTEMAS				out/17	out/17			-	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	082	3-Longo prazo	
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	A26.05	Promover soluções que utilizem dados eletrônicos da Administração Estadual como instrumentos de controle social	SERV-SISTEMAS				jan/00	jan/00			-	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	083		
NC26	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	A26.06	Viabilizar ferramenta para pesquisa de dados no diário oficial.	SERV-SISTEMAS				out/17	dez/17			-	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	083		
NC27	SERVÇOS DE TI	Viabilização da conexão do TCE-GO em redes sociais	A27.01	Permitir a adoção de redes sociais no TCE-GO	SERV-SUORTE	2	7 a 8 meses			jun/16	set/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-3	084			
NC28	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo	A28.01	Desenvolver projeto de divulgação de ações e atividades de controle externo na internet	SERV-SISTEMAS	2	4 meses		ago/17	nov/17	jun/17		2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0		085		
NC29	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade	A29.01	Realizar manutenção dos sistemas existentes para acessibilidade	SERV-SISTEMAS	2	4 meses		jan/18	mai/18	jun/17		2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0		086		
NC30	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP	A30.01	Realizar a implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP	PRESIDENCIA	2	5 meses		ago/18	dez/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0	Prioridade Revista	087		
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.01	Corrigir visualização dos documentos de manifestações de auditoria no website do tce, efetuar manutenção na página do Geobras, efetuar ajustes corretivos e evolutivos no serviço de atendimento ao cidadão	SERV-SISTEMAS	2	6 a 8 meses			jan/16	mar/16	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	088			
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.02	Desenvolver projeto de melhorias dos serviços do portal institucional	SERV-SISTEMAS	2	4 meses		jan/18	mai/18	jan/16		10 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Ação Continuada	089		
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.03	Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle social	SERV-SISTEMAS				ago/18	nov/18	jun/17		2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	090	3-Longo prazo	
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.04	Criar portal do Jurisdicionado	SERV-SISTEMAS				ago/18	nov/18	jun/17		2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	091	2-Médio prazo	
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.05	Criar portal da Ouvidoria	SERV-SISTEMAS				mai/17	jul/17	mai/17	jun/17	3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)		RS	-	Concluído	1	2017-8	092	2-Médio prazo	

NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.06	Desenvolver portal do Controle Interno	SERV-SISTEMAS			mai/17	jun/17	mai/17		3 meses					Em andamento	0	Atrazada	093	1-Curto prazo	
NC31	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	A31.07	Desenvolver portal da Diretoria de Planejamento	SERV-SISTEMAS			set/17	dez/17	jun/17		2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)				Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	094		
NC32	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver sistema de comunicação de irregularidades	A32.01	Desenvolver portal de comunicação de irregularidades	SERV-SISTEMAS	2	3 meses	mai/17	jun/17	mai/17	jun/17	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2017-9	095	1-Curto prazo	
NC33	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver sistema de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	A33.01	Desenvolver sistema para fiscalização de contratação de pessoal temporários	SERV-SISTEMAS	1	3 meses	set/17	nov/17			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação reterada	096	2-Médio prazo	
NC34	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística	A34.01	Desenvolver sistema GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Módulo de documentos TCE-DOCS)	SERV-SISTEMAS	2	9 meses	jun/17	fev/18	mar/17		5 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Em dia	097	3-Longo prazo	
NC35	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019	A35.01	Elaborar o PDTI 2018-2019	GER-TI	2	5 meses	ago/18	dez/18			-	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Não Iniciado	0		098		
NC35	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019	A35.02	Aprovar o PDTI 2018-2019	PRESIDENCIA	1	2 a 3 meses	dez/18	dez/18			-	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Não Iniciado	0		099		
NC36	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Modernização do Portal de Gestão de Pessoas	A36.01	Auxiliar na gestão novo portal de gestão de pessoas	SERV-SISTEMAS	2	12 meses	jan/17	dez/17	mai/17		3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação revalidada	100		
NC37	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado	A37.01	Desenvolver melhorias no sistema cadastro geral - GCAD	SERV-SISTEMAS	2	20 meses	mai/17	dez/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação revalidada	101	2-Médio prazo	
NC37	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado	A37.02	Prover solução para gerir a Estrutura Administrativa do estado	SERV-SISTEMAS			ago/17	nov/17			-	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	102	2-Médio prazo	
NC38	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar a atualização de competências das unidades de TI e formalizar proposição de uso de normativas específicas	A38.01	Revisar as competências das unidades de TI e formalizar proposição de uso de normativas específicas	GER-TI	3	1 e 9 meses			ago/16	set/16	2 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-4	103		
NC39	SERVIÇOS DE TI	Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo	A39.01	Realizar aquisição de solução de spam e de solução de Backup de e-mail	GER-TI	1	3 meses	set/16	nov/16	nov/16	mar/17	4 meses	INVESTIMENTO	RS	120.000,00	RS	70.570,00	Concluído	1	2017-1	104	
NC40	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver projeto de intercâmbio de informações (Ações de integração com a CGU)	A40.01	Desenvolver projeto de intercâmbio de informações (Ações de integração com a CGU)	GER-TI	8	Superior a 2 anos(a)			mai/16	nov/16	7 meses	PROCESSO INTERNO	RS		RS	-	Concluído	1	2016-4	105	
NC41	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental	A41.01	Desenvolver portal de divulgação da gestão documental e arquivística	SERV-SISTEMAS	2	12 meses	jan/18	dez/18	jun/17		2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0		106		
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.01	Realizar aquisição de Corel Draw / Photopaint	GER-TI	3	4 meses	mai/17	ago/17	mar/17		5 meses	INVESTIMENTO	RS	6.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	107	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.02	Realizar aquisição de Autodesk Autocad	GER-TI	1	4 meses	mai/17	ago/17	mar/17		5 meses	INVESTIMENTO	RS	48.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	108	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.03	Realizar aquisição de Adobe Photoshop	GER-TI	1	4 meses	mai/17	ago/17	mar/17		5 meses	INVESTIMENTO	RS	10.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	109	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.04	Realizar aquisição de Adobe Acrobat Pro	GER-TI	1	4 meses	mai/17	ago/17	mar/17		5 meses	INVESTIMENTO	RS	10.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	110	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.05	Realizar aquisição de Adobe InDesign	GER-TI	1	4 meses	mai/17	ago/17	mar/17		5 meses	INVESTIMENTO	RS	10.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	111	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.06	Realizar atualização do Pacote Microsoft Office	GER-TI	1	17 meses	ago/17	dez/18	mar/17		5 meses	INVESTIMENTO	RS	260.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	112	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.07	Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi	GER-TI	3	12 meses	jan/18	dez/18			-	INVESTIMENTO	RS	10.000,00	RS	-	Não Iniciado	0		113	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.08	Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Projetos (MS Project)	GER-TI	1	12 meses	jan/18	dez/18			-	INVESTIMENTO	RS	10.000,00	RS	-	Não Iniciado	0		114	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.09	Realizar investimento em solução de BI	GER-TI	8	5 meses	mai/17	set/17	fev/17		6 meses	INVESTIMENTO	RS	520.000,00	RS	-	Em andamento	0	Em dia	115	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.12	Realizar aquisição de Software de digitalização de documento com OCR (Kodak Pro)	GER-TI	1	4 meses	mai/17	ago/17	dez/16		8 meses	INVESTIMENTO	RS	50.000,00	RS	-	Em andamento	0	Atrazada (Área de Negócio)	116	
NC42	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de softwares aplicativos	A42.13	Realizar aquisição de Software Antivírus	GER-TI	1	5 meses	ago/18	dez/18			-	INVESTIMENTO	RS	45.000,00	RS	-	Não Iniciado	0		117	
NC43	SERVIÇOS DE TI	Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem	A43.01	Analisar viabilidade Soluções de armazenamento em nuvem	SERV-SUORTE	2	8 meses	mai/17	dez/17	abr/17		4 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Em andamento	0		118		
NC43	SERVIÇOS DE TI	Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem	A43.02	Realizar aquisição de solução de armazenamento em nuvem (Google Apps for Work)	GER-TI	1	12 meses	jan/17	dez/17			-	INVESTIMENTO	RS	45.000,00	RS	-	Não Iniciado	0		119	
NC44	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas	A44.01	Desenvolver sistema para gestão de declarações de bens e rendas	GER-TI	2	8 meses	jun/17	jan/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação reterada	120		
NC45	SERVIÇOS DE TI	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revistar Manuais de Sistemas, Guias)	A45.01	Centralizar e padronizar banco de dados e servidores web	SERV-SUORTE	2	1 a 3 meses			out/15	jan/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	121		
NC45	SERVIÇOS DE TI	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revistar Manuais de Sistemas, Guias)	A45.02	Documentar arquitetura. NLT de desenvolvimento de sistemas	SERV-SISTEMAS	2	1 a 3 meses			out/15	mar/16	3 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	122		
NC45	SERVIÇOS DE TI	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revistar Manuais de Sistemas, Guias)	A45.03	Priorizar e revisar/atualizar manuais de sistemas selecionados	SERV-SUORTE	2	24 meses	jan/17	dez/18			-	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Não Iniciado	0		123		
NC46	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP	A46.01	Auxiliar na gestão da manutenção no sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP	SERV-SISTEMAS	2	12 meses	jan/17	dez/17	mai/17		3 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação revalidada	124		


NC47	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver solução para solicitação de diárias	A47.01	Realizar levantamento de necessidades para elaboração de sistema para solicitação de diárias	SERV-SISTEMAS	2	3 a 6 meses			mar/16	abr/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	125		
NC47	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolver solução para solicitação de diárias	A47.02	Desenvolver sistema para solicitação de diárias	SERV-SISTEMAS	2	4 meses	mai/17	ago/17	mar/16		17 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Atraso (Linha de Negócio)	126		
NC48	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI	A48.01	Realizar diagnóstico de processos de gerenciamento de serviços de TI	GER-TI	4	7 meses	jan/18	jul/18	dez/16		8 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Em andamento	0	Em dia	127		
NC48	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI	A48.02	Mapear e implantar processos	GER-TI	4	5 meses	ago/18	dez/18	jun/16		14 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Em andamento	0	Em dia	128		
NC48	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI	A48.03	Aprimorar o sistema help-desk considerando o modelo de central de serviços.	SERV-SUORTE	2	5 meses	ago/18	dez/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0		129		
NC49	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais	A49.01	Realizar detalhamento de necessidades de solução de gerenciamento de processos organizacionais	SERV-SISTEMAS	2	12 meses	jan/18	dez/18			-	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Não Iniciado	0		130		
NC50	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilização de solução para gestão do conhecimento	A50.01	Implantar solução de gestão do conhecimento (WIKI)	SERV-SISTEMAS	2	3 a 6 meses			nov/15	jan/16	2 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	131		
NC51	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização	A51.01	Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay)	SERV-SISTEMAS	2	12 meses	jan/18	dez/18	jun/17		2 meses	INVESTIMENTO	RS	230.000,00	RS	-	Em andamento	0		132	
NC52	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial	A52.01	Avaliar viabilidade da plataforma existente do sistema de helpdesk para atender a manutenção predial	SERV-SISTEMAS	1	1 meses	dez/15	fev/16	jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	133		
NC52	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial	A52.02	Desenvolver sistema de gestão da manutenção predial	SERV-SISTEMAS	1	1 meses	dez/15	fev/16	jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	134		
NC52	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial	A52.03	Implantar sistema de gestão da manutenção predial	SERV-SISTEMAS	1	3 meses	dez/15	fev/16	mar/16	jun/16	4 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-2	135		
NC53	INFRAESTRUTURA DE TI	Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias	A53.01	Avaliar alternativa para instalação de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE	SERV-SUORTE	1	2 a 3 meses			fev/16	mar/16	2 meses	INVESTIMENTO	RS	20.000,00	RS	-	Concluído	1	2016-1	136	
NC53	INFRAESTRUTURA DE TI	Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias	A53.02	Realizar aquisição de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE	GER-TI	1	2 a 3 meses			abr/16	jun/16	3 meses	INVESTIMENTO	RS	30.000,00	RS	-	Concluído	1	2016-2	137	
NC54	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	A54.01	Realizar implantação do sistema GRAC	SERV-SISTEMAS	2	10 meses	jan/18	out/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Não Iniciado	0		138		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.01	Garantir continuidade ao negócio através da manutenção e evolução de sistemas diversos	SERV-SISTEMAS	12	20 meses	mai/17	dez/18	jan/16		19 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Em andamento	0	Ação Continuada	139		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.02	Aprimorar a pesquisa textual no Diário Eletrônico de Contas	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	140		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.03	Efetuar correção dos Gráficos de Entrada e Saída por Mês da ESTAÇÃO DIGITAL	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	141		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.04	Alterar do formulário de cálculo que não permita gerar o cálculo se não houvesse interessado no GCAR	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	142		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.05	Aprimorar a visualização e disponibilização dos documentos de Julgamento na ESTAÇÃO DIGITAL	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	143		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.06	Efetuar manutenção corretiva para uso em equipamentos 64bits no GREG	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	144		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.07	Alterar formulários Apresentadora, Pensão, Reforma, Reserva e Admissão para gravar dados de usuário, data e chefe do setor e mudança dos resatórios no GREG	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	145		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.08	Efetuar manutenção no software GREG (Gerência de Registro) permitindo UPLOAD do documento de registro nas funcionalidades do sistema	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	146		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.09	Implementar funcionalidade de Quadro de Avisos no sistema PUBLICA	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	147		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.10	Permitir alteração da data de publicação no sistema PUBLICA	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	148		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.11	Efetuar integração com sistema TFS, Criação da Suite do projeto no TFS, criação da solução do projeto, cadastro de operação, implementação configuração do Para	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	149		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.12	Construção de relatórios dinâmicos para o sistema de gestão de fiscalização - SGF, utilizando ferramenta de BI	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	PROCESSO INTERNO	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	150		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.13	Permitir que o sistema SINI seja executado no Terminal Server e em todas os sistemas operacionais existentes no âmbito do TFC-GO	SERV-SISTEMAS	12	1 ano e 3 meses			jan/16	mar/16	2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Concluído	1	2016-1	151		
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.14	Reestruturar a certificação do trânsito em julgado das decisões.	SERV-SISTEMAS			ago/18	nov/18			-	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Não Iniciado	000	Revisão 2017-1 - Ação Nova	152	3-Longo prazo	
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.15	Evolução GNDI	SERV-SISTEMAS			mai/17	dez/17	fev/17		6 meses	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	153	3-Longo prazo	
NC56	SERVIÇOS DE TI	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	A56.16	Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo	SERV-SISTEMAS			mar/18	jul/18	jul/17		1 meses	SISTEMA (CUSTEIO)			-	Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	154	3-Longo prazo	
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, prazos e soluções de TI	A57.01	Executar atividades de desenvolvimento grafico e tratamentos de fotos para o Jornal Mural ACONTICE	SERV-SISTEMAS	12	20 meses	mai/17	dez/18	jan/16		19 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Ação Continuada	155		
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	A57.02	Efetuar processamento de carga de dados das DUOP'S, manutenções em dados para consolidar fechamento mensal do Tesouro - sistema GORC	SERV-SISTEMAS	12	8 meses	mai/17	dez/17	jan/16		19 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	RS	RS	-	Em andamento	0	Ação Continuada	156		

NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	AS7.03	Realizar atividades de apoio técnico de AUDIUVISUAL em cursos, palestras, Sessões Plenárias e de Câmara, inclusive de transmissão (streaming) e gravação, quando for o caso.	SERV-SUORTE	12	24 meses	jan/17	dez/18	jan/16			10 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Em andamento	0	Ação Continuada	157	
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	AS7.04	Garantir continuidade ao negócio através da disponibilização de serviços de suporte técnico ao usuário (CENTRAL DE SERVIÇOS - HELPDESK)	SERV-SUORTE	12	24 meses	jan/17	dez/18	jan/16			10 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	-	Em andamento	0	Ação Continuada	158	
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	AS7.05	Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sustentação tecnológica	GER-TI	12	24 meses	jan/17	dez/18	jan/16			10 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	2.000.193,63	Em andamento	0	Ação Continuada	159	
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	AS7.06	Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras	SERV-SUORTE	12	24 meses	jan/17	dez/18	jan/16			10 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	720.000,00	Em andamento	0	Ação Continuada	160	
NC57	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	AS7.07	Gerenciar outras contratações acessórias	SERV-SUORTE	12	24 meses	jan/17	dez/18	jan/16			10 meses	PROCESSO INTERNO	R\$	R\$	742.519,37	Em andamento	0	Ação Continuada	161	
NC58	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMID)	AS8.01	Prover solução de gestão corporativa de riscos	GER-TI	3	12 meses	jan/18	dez/18				-	INVESTIMENTO	R\$	R\$	100.000,00	Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação reiterada	162	2-Médio prazo
NC59	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover solução para gestão de convênios (MMID)	AS9.01	Prover solução de gestão de convênios	SERV-SISTEMAS	2	3 meses	set/18	nov/18				-	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$		Não Iniciado	0		163	
NC60	INFORMÁTICA - SERVIÇOS	Atendimento aos usuários, bem como o gerenciamento de equipamentos e serviços de TI	A60.01	Aprimorar o portal de acesso à informação (SIC)	SERV-SISTEMAS	1	3 meses	mai/17	jul/17	mar/17	jun/17	4 meses	SISTEMA (CUSTEIO)	R\$	R\$		Concluído	1	2017-6	164		
NC60	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento de serviços para atender questões de transparência propostas pela INCCIA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal.	A60.02	Conceber aplicativo móvel para efetivo canal de comunicação com a sociedade, disponibilizando informações transparentes da gestão pública	SERV-SISTEMAS	3	7 meses	set/17	mar/18	jun/17			2 meses	SISTEMA (CUSTEIO)				Em andamento	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	165	3-Longo prazo
NC60	INFORMÁTICA - SERVIÇOS	Atendimento aos usuários, bem como o gerenciamento de equipamentos e serviços de TI	A60.03	Reformular portal de Transparência	SERV-SISTEMAS	2	3 meses	mai/17	jul/17	mar/17	jun/17	4 meses	SISTEMA (CUSTEIO)		R\$		Concluído	1	2017-7	166	1-Curto prazo	
NC61	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos	A61.01	Desenvolver solução para fiscalização e acompanhamento de concursos públicos	SERV-SISTEMAS	1	7 meses	jan/18	jul/18				-	SISTEMA (CUSTEIO)				Não Iniciado	0	Revisão 2017-1 - Ação Nova	167	3-Longo prazo
NC62	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa via TCS-400	A62.01	Prover suporte tecnológico às demandas de novos canais de comunicação, tratamento e exibição de vídeos, TV corporativa	SERV-SISTEMAS	1	8 meses	jan/17	ago/17	jul/17			1 meses					Em andamento	0	Atrasada	169	1-Curto prazo

CATEGORIA	TOTAL DE AÇÕES PLANEJADAS	META - %	META - QTDE	EM ANDAMENTO	%	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO %
Pessoal de TI	3	100%	3	1	33%	1	33%
Sistemas de Informação	83	70%	58	28	34%	33	40%
Governança e Gestão de TI	31	70%	22	12	59%	10	32%
Serviços de TI	28	90%	25	5	18%	20	71%
Infraestrutura de TI	24	90%	22	2	8%	19	79%
TOTAL	169	77%	130	48	28%	83	49%

	ESTIMADO	REALIZADO
TOTAIS	R\$ 15.669.271,15	R\$ 9.009.817,23
2016	R\$	6.195.177,29
2017-1	R\$	7.427.429,39
2017-2	R\$	1.881.218,04

UNIDADE RESPONSÁVEL	TOTAL DE AÇÕES PLANEJADAS	TOTAL DE AÇÕES CONCLUÍDAS
GER-TI	53	22
SERV-SISTEMAS	91	48
SERV-SUORTE	16	6
PRESIDENCIA	9	7
TOTAL	169	83

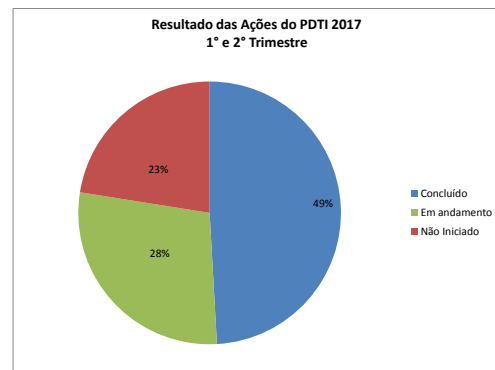

SITUAÇÃO	QTDE	%
Concluído	83	49%
Em andamento	48	28%
Não iniciado	38	22%
TOTAL	169	100%

Plano de Investimento e Custeio			* Os valores na tabela abaixo são meras estimativas, considerando cenários econômicos na época de levantamento realizado. Pesquisas orçamentárias deverão preceder cada ação a fim de comprovar o real valor de mercado.						
ID Nec.	ID Ação	Classificação	Categoria	NECESSIDADE / PROJETO	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
NC04	A03.03	CUSTEIO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	LICITAÇÃO para contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados	36	MENSAL	R\$ 250.000,00	R\$ 9.000.000,00	
NC08	A08.02	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	Realizar aquisição de ferramenta de acesso remoto estável	10	UNIDADE	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	
NC08	A08.05	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	LICITAÇÃO para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores	1	UNIDADE	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	
NC08	A08.06	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	Aprimoramento de recursos do Banco de Dados (Oracle Enterprise)	1	UNIDADE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
NC08	A08.07	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	Realizar aquisição de equipamentos servidores	1	UNIDADE	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	
NC08	A08.08	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	Aquisição de Soluções de Segurança da Informação (Firewall / Web Proxy Corporativo)	1	UNIDADE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
NC08	A08.11	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	Efetivar aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (Adesão ata)	1	UNIDADE	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	
NC08	A08.12	CUSTEIO	INFRAESTRUTURA DE TI	Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento)	3	ANUAL	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	
NC09	A08.13	CUSTEIO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Contratação de Serviços de Manutenção de BANCO DE DADOS - ORACLE	1	UNIDADE	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
NC09	A08.14	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de Equipamentos de Armazenamento (Discos Storage)	1	UNIDADE	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
NC17	A17.01	INVESTIMENTO	INFRAESTRUTURA DE TI	Realizar aquisição de computadores	170	UNIDADE	R\$ 5.000,00	R\$ 850.000,00	
NC18	A17.02	INVESTIMENTO	SERVIÇOS DE TI	Realizar aquisição de monitores	200	UNIDADE	R\$ 500,00	R\$ 100.000,00	
NC19	A17.03	INVESTIMENTO	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Realizar aquisição de scanners	50	UNIDADE	R\$ 5.000,00	R\$ 250.000,00	
NC19	A17.04	INVESTIMENTO	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Realizar aquisição de Dispositivos Móveis (Notebooks/Tablets/Smartphones)	80	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 320.000,00	
NC21	A20.01	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Executar plano de Capacitação dos servidores de TI	1	TOTAL	R\$ 96.271,15	R\$ 96.271,15	
NC26	A24.03	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Aprimoramento da infraestrutura do datacenter da nova sede	1	UNIDADE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
NC27	A24.04	INVESTIMENTO	SERVIÇOS DE TI	Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE	0	-	R\$ -	R\$ -	
NC42	A39.01	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de solução de spam e de solução de Backup de e-mail	1	UNIDADE	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	
NC42	A42.01	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Corel Draw / Photopaint	5	UNIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00	
NC42	A42.02	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Autodesk Autocad	3	UNIDADE	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00	
NC42	A42.03	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Adobe PhotoShop	5	UNIDADE	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	
NC42	A42.04	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Adobe Acrobat Pro	10	UNIDADE	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	
NC42	A42.05	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Adobe InDesign	5	UNIDADE	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	
NC42	A42.06	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar atualização do Pacote Microsoft Office	500	UNIDADE	R\$ 520,00	R\$ 260.000,00	
NC42	A42.07	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi	5	UNIDADE	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	
NC42	A42.08	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Projetos (MS Project)	5	UNIDADE	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	

NC42	A42.09	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar investimento em solução de BI	1	UNIDADE	R\$	520.000,00	R\$	520.000,00
NC42	A42.10	#N/D	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	#N/D	1	UNIDADE	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
NC42	A42.11	#N/D	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	#N/D	12	UNIDADE	R\$	1.000,00	R\$	12.000,00
NC43	A42.12	INVESTIMENTO	SERVIÇOS DE TI	Realizar aquisição de Software de digitalização de documento com OCR (Kodak Pro)	5	UNIDADE	R\$	2.000,00	R\$	10.000,00
NC43	A42.13	INVESTIMENTO	SERVIÇOS DE TI	Realizar aquisição de Software Antivírus	500	UNIDADE	R\$	90,00	R\$	45.000,00
NC44	A43.02	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de solução de armazenamento em nuvem (Google Apps for Work)	500	UNIDADE	R\$	90,00	R\$	45.000,00
NC52	A51.01	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay)	1	UNIDADE	R\$	230.000,00	R\$	230.000,00
NC54	A53.01	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Avaliar alternativa para instalação de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE	1	UNIDADE	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
NC55	A53.02	INVESTIMENTO	#N/D	Realizar aquisição de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE	1	UNIDADE	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
NC57	A57.06	PROCESSO INTERNO	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI	Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras	36	MENSAL	R\$	20.000,00	R\$	720.000,00
NC58	A58.01	INVESTIMENTO	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prover solução de gestão corporativa de riscos	1	MENSAL	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00

CATEGORIA	TOTAL DE NECESSIDADES	META - %	META - QTD	TOTAL	R\$	15.689.271,15
Sistemas de Informação	21	70%	15			
Governança e Gestão de TI	3	70%	2			
Infraestrutura de TI	8	90%	7			
Pessoal de TI	0	100%	0			
Serviços de TI	4	90%	4			
TOTAL	36	77%	28			

CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DE NECESSIDADES
CUSTEIO	3
INVESTIMENTO	31

Plano de Capacitação							
CURSO	EIXO TEMÁTICO	CAPACITAÇÃO	QTDE (VAGAS)	REALIZADO (PESSOAS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ORIGEM
1	Gestão e Governança de TI	Gestão de Segurança da Informação, com certificação ISO/IEC 27.002 Foundation.	2		R\$ 1.520,00	R\$ 3.040,00	http://www.masterhouse.com.br/hdn/agenda/iso27002-pe.htm
2	Gestão e Governança de TI	Análise e melhoria de processos, com foco em modelagem de processos de negócio (BPM).	4		R\$ 445,00	R\$ 1.780,00	http://www.training.com.br/cursos-bpmm-bpm
3	Gestão e Governança de TI	COBIT 5, com certificação COBIT 5 Foundation	3		R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,00	http://www.training.com.br/cursos/curso-cobit-5-foundation
4	Gestão e Governança de TI	Curso de SCRUM com certificação SCRUM master da CSM	2		R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	http://agiletrendsbr.com/csm-certified-scrummaster/
5	Gestão e Governança de TI	ITIL 2011, com certificação ITIL Foundation	3		R\$ 1.580,00	R\$ 4.740,00	http://www.masterhouse.com.br/hdn/agenda/itilf-go.htm
6	Gestão e Governança de TI	Capacitação em gerenciamento de projetos	2		R\$ 1.440,00	R\$ 2.880,00	https://esr.rnp.br/gti6
7	Gestão e Governança de TI	Gestão de Processos de Negócios (BPM)	3		R\$ 1.890,00	R\$ 5.670,00	http://www.innovia.com.br/cursos/processos/curso-de-gestao-de-processos
8	Gestão e Governança de TI	Gestão de Riscos de SI - ISO 27005	2		R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00	https://esr.rnp.br/gti9
9	Gestão e Governança de TI	Desenvolvimento de Gestores de TI	4		R\$ -	R\$ -	Curso da ENAP
10	Gestão e Governança de TI	Capacitação em gestão de Contratos de TI	4		R\$ -	R\$ -	Curso da ENAP
11	Gestão e Governança de TI	Melhoria de Processos de Software na Administração - MPS-BR	2		R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	http://www.softex.br/curso-de-introducao-ao-mps-br-c1-mps-br-2/
12	Gestão e Governança de TI	Security Officer Foundation	2		R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	http://www.datasecurity.com.br/index.php/cursos/security-officer-foundation
13	Gestão e Governança de TI	Security Officer Advanced	2		R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00	http://www.datasecurity.com.br/index.php/cursos/security-officer-advanced
14	Gestão e Governança de TI	Proteção de perímetros de rede e hardening de servidores	2		R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00	https://esr.rnp.br/seg10 https://esr.rnp.br/seg2
15	Gestão e Governança de TI	Auditoria de Segurança em Aplicações Web	2		R\$ 890,00	R\$ 1.780,00	http://www.clavis.com.br/treinamento-ensino-a-distancia-ead/auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web/index.php
16	Gestão e Governança de TI	Análise de Negócio	4		R\$ 445,00	R\$ 1.780,00	http://www.training.com.br/cursos/curso-ant-bpm-analista-negocios-ti-babok
17	Infraestrutura de TI	Formação básica em Banco de Dados Oracle	1		R\$ 2.389,00	R\$ 2.389,00	http://www.training.com.br/formacao/formacao-oracle-dba-11g
18	Infraestrutura de TI	Gerência de Redes de Computadores	2		R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00	https://esr.rnp.br/adr5
19	Infraestrutura de TI	Monitoramento de Ativos com Zabbix	2		R\$ 450,00	R\$ 900,00	http://www.treinamentolinux.com.br/curso-monitoramento-com-zabbix/
20	Infraestrutura de TI	Backup com HP Data Protector	1		R\$ 5.406,15	R\$ 5.406,15	http://www.tre-al.jus.br/arquivos/tre-pa-pagamento-a-fornecedores-maio-2011

21	Infraestrutura de TI	Virtualização Profissional com Vmware	2		R\$ 995,00	R\$ 1.990,00	http://www.training.com.br/cursos/curso-vmware-instalar-configurar-gerenciar-v5
22	Sistemas de Informação	Análise de Pontos de Função	2		R\$ 899,00	R\$ 1.798,00	http://www.fattocs.com/pt/capf-sp
23	Sistemas de Informação	Arquitetura de Software	2		R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	http://www.fumsoft.org.br/eventos/29072015-curso-arquitetura-agil-de-software
24	Sistemas de Informação	Capacitação em Team Foundation Server	2		R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	https://gpinproject.wordpress.com/2010/09/04/curso-team-foundation-server-2010-fundamentals-e-scrum-fundamental-em-fortaleza/
25	Sistemas de Informação	Capacitação em ferramentas Visual Studio	2		R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00	https://www.impacta.com.br/curso/C-2013-Fundamentos.php
26	Sistemas de Informação	Testes de Software e integração contínua	2		R\$ 999,00	R\$ 1.998,00	http://www.fattocs.com/pt/testesw-bsb
27	Sistemas de Informação	Engenharia de Requisitos	2		R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	http://www.cits.br/index.php/servicos/capitacao/agenda?id=75
28	Sistemas de Informação	PENTAHO	3	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	
29	Todas as áreas	Participação em Congressos, workshops e eventos técnicos.	4		R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	
			70	3	TOTAL: R\$ 96.271,15		

META:	REALIZAR PELO MENOS 15 CURSOS
TOAL DE CURSOS REALIZADOS:	1


ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - OBJETIVOS DO PDTI

NC	OBJ	Descrição da Necessidade	Conclusão
NC01	2	Atualização de sistema para atender à nova configuração de sistema judicial	100%
NC02	2	Atualização de sistema para flexibilização de rotinas e processos	100%
NC03	6	Implementação de sistema judicial especializado em planejamento e execução de software infraestrutura de TI administrativa do Brasil de Direito	100%
NC04	4	Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de sistema de Processos	100%
NC05	2	Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de informações sobre processos com fontes externas integradas	100%
NC06	4	Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de compromissos de decisões	100%
NC07	2	Desenvolvimento de sistema de gerenciamento e consolidação de agendas e participações	100%
NC08	3	Manutenção, atualização e melhoria da infraestrutura de TI de rede de comunicação	100%
NC09	6	Manutenção, atualização e melhoria da infraestrutura de TI de rede de comunicação	100%
NC10	7	Manutenção, atualização e melhoria da infraestrutura de TI de rede de comunicação	100%
NC11	10	Manutenção, atualização e melhoria da infraestrutura de TI de rede de comunicação	100%
NC12	4	Manutenção e atualização de sistema TCE-SP	100%
NC13	6	Manutenção e atualização de sistema TCE-SP	100%
NC14	1	Manutenção de sistema TCE-SP	100%
NC15	5	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC16	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC17	5	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC18	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC19	5	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC20	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC21	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC22	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC23	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC24	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC25	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC26	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC27	5	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC28	7	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC29	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC30	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC31	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC32	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC33	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC34	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC35	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC36	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC37	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC38	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC39	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC40	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC41	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC42	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC43	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC44	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC45	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC46	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC47	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC48	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC49	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC50	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC51	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC52	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC53	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC54	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC55	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC56	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC57	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC58	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC59	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC60	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC61	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%
NC62	1	Implementação de Gestão Estratégica de TI	100%

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI	
MISSÃO	Prover serviços de TI alinhados às necessidades do TCE-SP, assegurando valor ao cumprimento da missão institucional.
VALORES	Ser reconhecido como unidade estratégica do TCE-SP pela qualidade, eficiência e relevância dos serviços prestados.
VALORES	Transparência, Efetividade, Colaboração, Celeridade.

PERSPECTIVA	ID	OBJETIVO	NC	ATENDIDAS	%	DESCRIÇÃO
CONDIÇÕES PARA O ENTENDIMENTO	1	Aprimorar a Governança de TI	8	3	38%	Implementar a governança alinhada à sua atuação com o planejamento estratégico institucional, padronizando seus procedimentos e potencializando o uso de seus recursos.
	2	Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais	28	6	21%	Quando possível, implementar soluções de TI nas atividades exercidas por pessoas, com o intuito de apoiar e aumentar a eficiência e eficácia dos processos organizacionais.
	3	Promover a Segurança da Informação	5	1	20%	Promover a garantia da integridade, a disponibilidade e a confiabilidade das informações geradas e controladas pelo Tribunal, de acordo com as melhores práticas de segurança da informação.
RECURSOS HUMANOS	4	Aprimorar entrega de soluções de TI	14	2	14%	Melhorar a entrega de soluções de TI com qualidade e prazos para garantir a satisfação do cliente.
	5	Aprimorar os processos organizacionais de TI	6	2	33%	Monitorar e aperfeiçoar a execução de atividades internas de TI para que sejam eficazes e eficientes.
INFRAESTRUTURA	6	Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI	12	4	33%	Mantém o parque tecnológico atualizado e disponível para suportar as ações do registro.
	7	Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal	6	1	17%	Prover recursos materiais e tecnológicos de forma a garantir o acesso e a utilização dos sistemas e serviços essenciais, com o maior índice de tolerância a falhas possível.
PROFISSIONAL	8	Promover a capacitação dos servidores de TI	1	0	0%	Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores de TI, a fim de que tenham condições de atuar para o alcance dos objetivos institucionais.
	9	Mantém adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia	1	0	0%	Aumentar e manter o número de servidores de TI do Tribunal, visando suportar o crescimento existente e atender os objetivos estratégicos do PDTI.
ENCADRE	10	Aprimorar a aplicação de recursos e investimentos em TI	8	1	13%	Aplicar recursos e investimentos em TI nos que somente trará resultados, para a inovação.
TOTALS:			88	20	22%	

Objetivo de Linha	Soma de %
OBJ 10	13%
OBJ 09	0%
OBJ 08	0%
OBJ 07	17%
OBJ 06	33%
OBJ 05	33%
OBJ 04	14%
OBJ 03	20%
OBJ 02	21%
OBJ 01	38%
Total Geral	189%

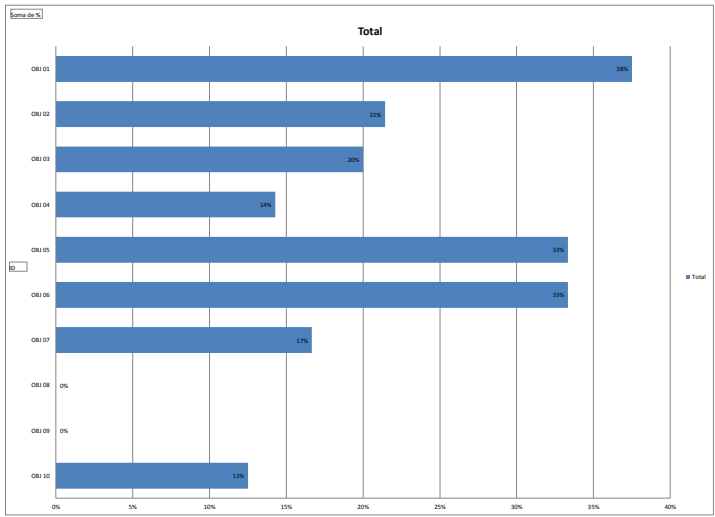

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

NC	OBJ	Descrição da Necessidade	Concluído
NC01	PD 2015-J	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	75%
NC01	PD 2015-L	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	75%
NC01	PEI10	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público	75%
NC02	PD 2015-G	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	100%
NC02	PEI02	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	100%
NC02	PEI03	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	100%
NC02	PEI04	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	100%
NC02	PEI10	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	100%
NC02	PD 2016-D	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos	100%
NC03	PEI21	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software	100%
NC03	PEI23	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software	100%
NC04	PD 2015-F	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário	50%
NC04	PEI10	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário	50%
NC05	PD 2015-L	Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas	0%
NC05	PEI10	Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas	0%
NC06	PD 2015-D	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões	50%
NC06	PD 2016-D	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões	50%
NC07	PD 2015-C	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	50%
NC07	PD 2015-F	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	50%
NC07	PEI10	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	50%
NC07	PD 2016-D	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência	50%
NC08	PEI21	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	86%
NC08	PEI23	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação	86%
NC09	PD 2015-C	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris	100%
NC09	PD 2015-F	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris	100%
NC09	PD 2016-D	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris	100%
NC10	PEI01	Implantação de Comitê Estratégico de TI	100%
NC10	PEI12	Implantação de Comitê Estratégico de TI	100%
NC10	PEI15	Implantação de Comitê Estratégico de TI	100%
NC10	PEI18	Implantação de Comitê Estratégico de TI	100%
NC10	PEI22	Implantação de Comitê Estratégico de TI	100%
NC10	PD 2016-D	Implantação de Comitê Estratégico de TI	100%
NC11	PEI01	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	67%
NC11	PEI15	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	67%
NC11	PEI20	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI	67%
NC12	PD 2015-T	Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI.	50%
NC13	PD 2015-B	Sustentação e evolução do sistema GPRO	75%
NC14	PEI01	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI10	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI11	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI12	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI15	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI18	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI20	Implantação da governança de TI	0%
NC14	PEI22	Implantação da governança de TI	0%
NC15	PD 2015-B	Conclusão da implantação de processo eletrônico	67%
NC15	PD 2015-K	Conclusão da implantação de processo eletrônico	67%
NC15	PEI10	Conclusão da implantação de processo eletrônico	67%
NC16	PEI01	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	100%
NC16	PEI15	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	100%
NC16	PEI18	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	100%
NC16	PEI22	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI	100%

NC17	PEI05	Modernização do parque tecnológico	50%
NC17	PEI10	Modernização do parque tecnológico	50%
NC17	PEI15	Modernização do parque tecnológico	50%
NC17	PEI21	Modernização do parque tecnológico	50%
NC17	PEI23	Modernização do parque tecnológico	50%
NC18	PD 2015-P	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servi	0%
NC19	PD 2015-G	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	29%
NC19	PEI10	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	29%
NC19	PEI15	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	29%
NC19	PEI21	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	29%
NC19	PEI23	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	29%
NC19	PD 2016-D	Implantação da Gestão de Segurança da Informação	29%
NC20	PD 2015-P	Capacitação dos servidores de TI	0%
NC21	PD 2015-G	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.	100%
NC21	PEI10	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.	100%
NC22	PD 2015-K	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de docum	100%
NC22	PEI10	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de docum	100%
NC22	PEI10	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de docum	100%
NC22	PEI5	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de docum	100%
NC23	PEI10	Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem pr	0%
NC24	PD 2015-V	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede	75%
NC24	PD 2015-W	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede	75%
NC25	PEI10	Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa	0%
NC26	PD 2015-G	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC26	PEI01	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC26	PEI02	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC26	PEI03	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC26	PEI04	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC26	PEI07	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC26	PEI10	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.	17%
NC27	PD 2015-N	Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais	100%
NC27	PEI10	Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais	100%
NC28	PD 2015-M	Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo	0%
NC29	PEI10	Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade	0%
NC30	PD 2015-G	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento -	0%
NC30	PD 2015-H	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento -	0%
NC30	PEI10	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento -	0%
NC31	PD 2015-N	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	29%
NC31	PEI10	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	29%
NC31	PD 2016-D	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO	29%
NC32	PD 2015-N	Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregul	100%
NC32	PEI10	Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregul	100%
NC33	PD 2015-G	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	0%
NC33	PEI02	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	0%
NC33	PEI03	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	0%
NC33	PEI04	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	0%
NC33	PEI10	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários	0%
NC34	PD 2015-B	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística	0%
NC35	PEI01	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019	0%
NC35	PEI12	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019	0%
NC35	PEI15	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019	0%
NC36	PD 2015-U	Modernização do Portal de Gestão de Pessoas	0%
NC36	PEI10	Modernização do Portal de Gestão de Pessoas	0%
NC37	PD 2015-B	Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacio	0%

NC37	PEI10	Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional	0%
NC38	PD 2015-C	Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI	100%
NC39	PEI21	Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo	100%
NC39	PEI23	Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo	100%
NC40	PD 2015-G	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração	100%
NC40	PD 2015-H	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração	100%
NC40	PD 2015-I	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração	100%
NC40	PD 2015-J	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração	100%
NC41	PD 2015-B	Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental	0%
NC42	PEI10	Aquisição de softwares aplicativos	0%
NC43	PEI10	Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem	0%
NC44	PEI02	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas	0%
NC44	PEI03	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas	0%
NC44	PEI04	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas	0%
NC44	PEI10	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas	0%
NC45	PEI15	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manual)	67%
NC45	PEI20	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manual)	67%
NC46	PEI10	Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP	0%
NC47	PEI10	Desenvolver solução para solicitação de diárias	50%
NC48	PEI01	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI	0%
NC48	PEI10	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI	0%
NC49	PEI10	Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais	0%
NC50	PEI10	Viabilização de solução para gestão do conhecimento	100%
NC51	PEI10	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização	0%
NC51	PEI11	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização	0%
NC51	PEI12	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização	0%
NC52	PEI10	Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial	100%
NC53	PEI10	Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões	100%
NC53	PD 2016-D	Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões	100%
NC54	PEI02	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC54	PEI03	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC54	PEI04	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC54	PEI10	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC55	PEI02	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC55	PEI03	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC55	PEI04	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC55	PEI06	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC55	PEI10	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão	0%
NC56	PEI21	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	75%
NC56	PEI23	Ajustar sistemas internos às necessidades dos usuários.	75%
NC57	PEI21	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	0%
NC57	PEI23	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI	0%
NC58	MMD-TC	Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD)	0%
NC59	MMD-TC	Prover solução para gestão de convênios (MMD)	0%
NC60	MMD-TC	Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, b	67%
NC61	PEI 2.04	Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos	0%
NC62	PEI 4.01	Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO	0%

ÁREAS DEMANDANTES

ID	SIGLA	Descrição da Necessidade
NC01	GAMB	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público
NC01	GER-CONTAS	Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público
NC02	GER-LICITACAO	Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos
NC03	GER-TI	Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software, infraestrutura de TI e administração de banco de dados
NC04	GCEF	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
NC04	GCCR	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
NC04	SEC-GERAL	Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
NC05	GPRES	Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares
NC06	GCSM	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
NC06	GPRES	Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
NC07	GAHH	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07	GCKT	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07	GCSM	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07	GPRES	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07	SERV-JURISP	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07	SERV-REGISTRO	Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC08	GAMB	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	GER-FISCALIZA	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	GER-TI	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	MPC	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	SEC-CEXTERNO	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	DIR-PLAN	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	SERV-ARQUIVO	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	ILB	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	SERV-JURISP	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08	SERV-MATERIAL	Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC09	GAHH	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	GCCR	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	GER-ATOSPESAOAL	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	GER-ATOSPESAOAL	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	GER-FISCALIZA	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	GER-LICITACAO	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	SEC-GERAL	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	DIR-PLAN	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	SERV-JURISP	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	SERV-JURISP	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09	SERV-REGISTRO	Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC10	GCCR	Implantação de Comitê Estratégico de TI
NC10	GER-TI	Implantação de Comitê Estratégico de TI
NC11	GER-TI	Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI
NC12	GER-TI	Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI.
NC13	GAFR	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	GAHH	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	GCCR	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	GCEF	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	GCKT	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	GCKT	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	GCSM	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	SEC-CEXTERNO	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	SEC-GERAL	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	SEC-ADMIN	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13	DIR-PLAN	Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC14	GER-TI	Implantação da governança de TI
NC15	GCSM	Conclusão da implantação de processo eletrônico
NC15	GPRES	Conclusão da implantação de processo eletrônico
NC15	SEC-ADMIN	Conclusão da implantação de processo eletrônico
NC16	GER-TI	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI
NC16	DIR-PLAN	Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI
NC17	ASS-COM	Modernização do parque tecnológico
NC17	DIR-JUR	Modernização do parque tecnológico
NC17	GAHH	Modernização do parque tecnológico
NC17	GER-TI	Modernização do parque tecnológico
NC17	MPC	Modernização do parque tecnológico
NC17	SEC-CEXTERNO	Modernização do parque tecnológico
NC17	DIR-PLAN	Modernização do parque tecnológico
NC18	ASS-COM	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	CO-INTERNO	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	GCEF	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	GCKT	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	GER-ATOSPESAOAL	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	GER-REGISTRO	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	MPC	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	SEC-CEXTERNO	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	SERV-ARQUIVO	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	ILB	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	SERV-JURISP	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18	SERV-REGISTRO	Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral

NC19	GER-TI	Implantação da Gestão de Segurança da Informação
NC19	SERV-ESTRATEGICO	Implantação da Gestão de Segurança da Informação
NC20	GER-TI	Capacitação dos servidores de TI
NC21	GER-ATOSPESSOAL	Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.
NC22	GAFR	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
NC22	GCCR	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
NC22	MPC	Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
NC23	GAHH	Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos
NC24	GER-TI	Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede
NC25	ILB	Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa
NC26	GPRES	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.
NC26	DIR-PLAN	Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.
NC27	ASS-COM	Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais
NC28	GER-FISCALIZA	Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo
NC29	DIR-JUR	Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade
NC29	ILB	Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade
NC30	GAMB	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFFP
NC30	SERV-ATOSPESSOAL	Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFFP
NC31	SEC-GERAL	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO
NC31	SERV-PROTOCOLO	Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO
NC32	ASS-COM	Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades
NC33	GER-ATOSPESSOAL	Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários
NC34	GAFR	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	GCCR	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	GCEF	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	CORREGEDORIA	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	GER-PESSOAS	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	SEC-ADMIN	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	SEC-GERAL	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34	DIR-PLAN	Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC35	GER-TI	Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019
NC36	GER-PESSOAS	Modernização do Portal de Gestão de Pessoas
NC37	GER-ATOSPESSOAL	Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado
NC38	GER-TI	Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI
NC39	GER-TI	Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo
NC40	GAFR	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração Pública
NC40	GCSM	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração Pública
NC40	GER-COMUNICA	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração Pública
NC40	SEC-GERAL	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração Pública
NC40	SERV-PUBLICA	Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros órgãos da Administração Pública
NC41	GER-GDOC	Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental
NC41	SEC-GERAL	Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental
NC41	SERV-ARQUIVO	Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental
NC42	ASS-COM	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	DIR-JUR	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	GER-ADMIN	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	GER-FISCALIZA	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	GER-PESSOAS	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	GER-TI	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	SEC-CEXTERNO	Aquisição de softwares aplicativos
NC42	DIR-PLAN	Aquisição de softwares aplicativos
NC43	MPC	Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem
NC44	GER-ATOSPESSOAL	Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas
NC45	CORREGEDORIA	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias)
NC45	GER-TI	Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias)
NC46	SERV-MATERIAL	Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP
NC47	GER-ENG	Desenvolver solução para solicitação de diárias
NC48	GER-TI	Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI
NC49	CORREGEDORIA	Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais
NC49	DIR-PLAN	Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais
NC50	DIR-PLAN	Viabilização de solução para gestão do conhecimento
NC51	CORREGEDORIA	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização
NC51	DIR-PLAN	Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização
NC52	SEC-ADMIN	Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial
NC53	ASS-COM	Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias
NC54	SEC-CEXTERNO	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão
NC55	SEC-CEXTERNO	Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão
NC56	ASS-COM	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	CO-INTERNO	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	GAHH	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	GCEF	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	GER-ATOSPESSOAL	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	GER-FISCALIZA	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	GER-PESSOAS	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	MPC	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	ILB	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SEC-ADMIN	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SEC-CEXTERNO	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SEC-GERAL	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.

NC56	DIR-PLAN	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SERV-JURISP	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SERV-LOGISTICA	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SERV-MATERIAL	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56	SERV-REGISTRO	Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC57	CO-INTERNO	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	GAHH	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	GCEF	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	GER-ATOSPESSOAL	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	GER-FISCALIZA	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	GER-PESSOAS	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	MPC	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	ILB	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SEC-ADMIN	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SEC-CEXTERNO	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SEC-GERAL	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	DIR-PLAN	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SERV-JURISP	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SERV-LOGISTICA	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SERV-MATERIAL	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57	SERV-REGISTRO	Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC58	CO-INTERNO	Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD)
NC59	SEC-CEXTERNO	Prover solução para gestão de convênios (MMD)
NC60	OUVIDORIA	Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal
NC61	SEC-CEXTERNO	Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos
NC62	ASS-COM	Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO

